

PRINCE2.PRINCE2-Agile-Practitioner.v2025-01-21.q18

試験コード:	PRINCE2-Agile-Practitioner
試験名称:	PRINCE2 Agile Practitioner Project Management Exam
認定資格:	PRINCE2
無料問題数:	18
バージョン:	v2025-01-21
アクセス数:	231
ページビュー数:	180
https://www.jpnpdf.com/PRINCE2.PRINCE2-Agile-Practitioner.v2025-01-21.q18-mondaishu.html	

最新問題: 1

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう！

(注シナリオ内の企業や人物は架空のものです)

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6 人制サッカー トーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16 歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGA の自己資金政策の一環として、これは LGA (したがって地元の納税者) の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツ センターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツ イベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカー トーナメントには、キッズ ゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベント ビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにある LGA 所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するためのウェブサイト、家族でのお出かけをサポートするイベント ビレッジ、イベントの運営とサポートを行うボランティアとしての LGA スタッフのトレーニング、申し込みを処理するバック オフィス プロセス、イベントの費用を賄うための資金調達。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の 4 つの作業ストリームで構成されています。


1. マーケティング
2. ウェブサイト
3. イベントビレッジ
4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGA は PRINCE2 の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクト マネージャーは PRINCE2 Agile に完全に精通しています。町の中心にある LGA ビルの 1 つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクト マネージャーはすでにドアに「ミッション コントロール」と書かれた看板を掲げています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。

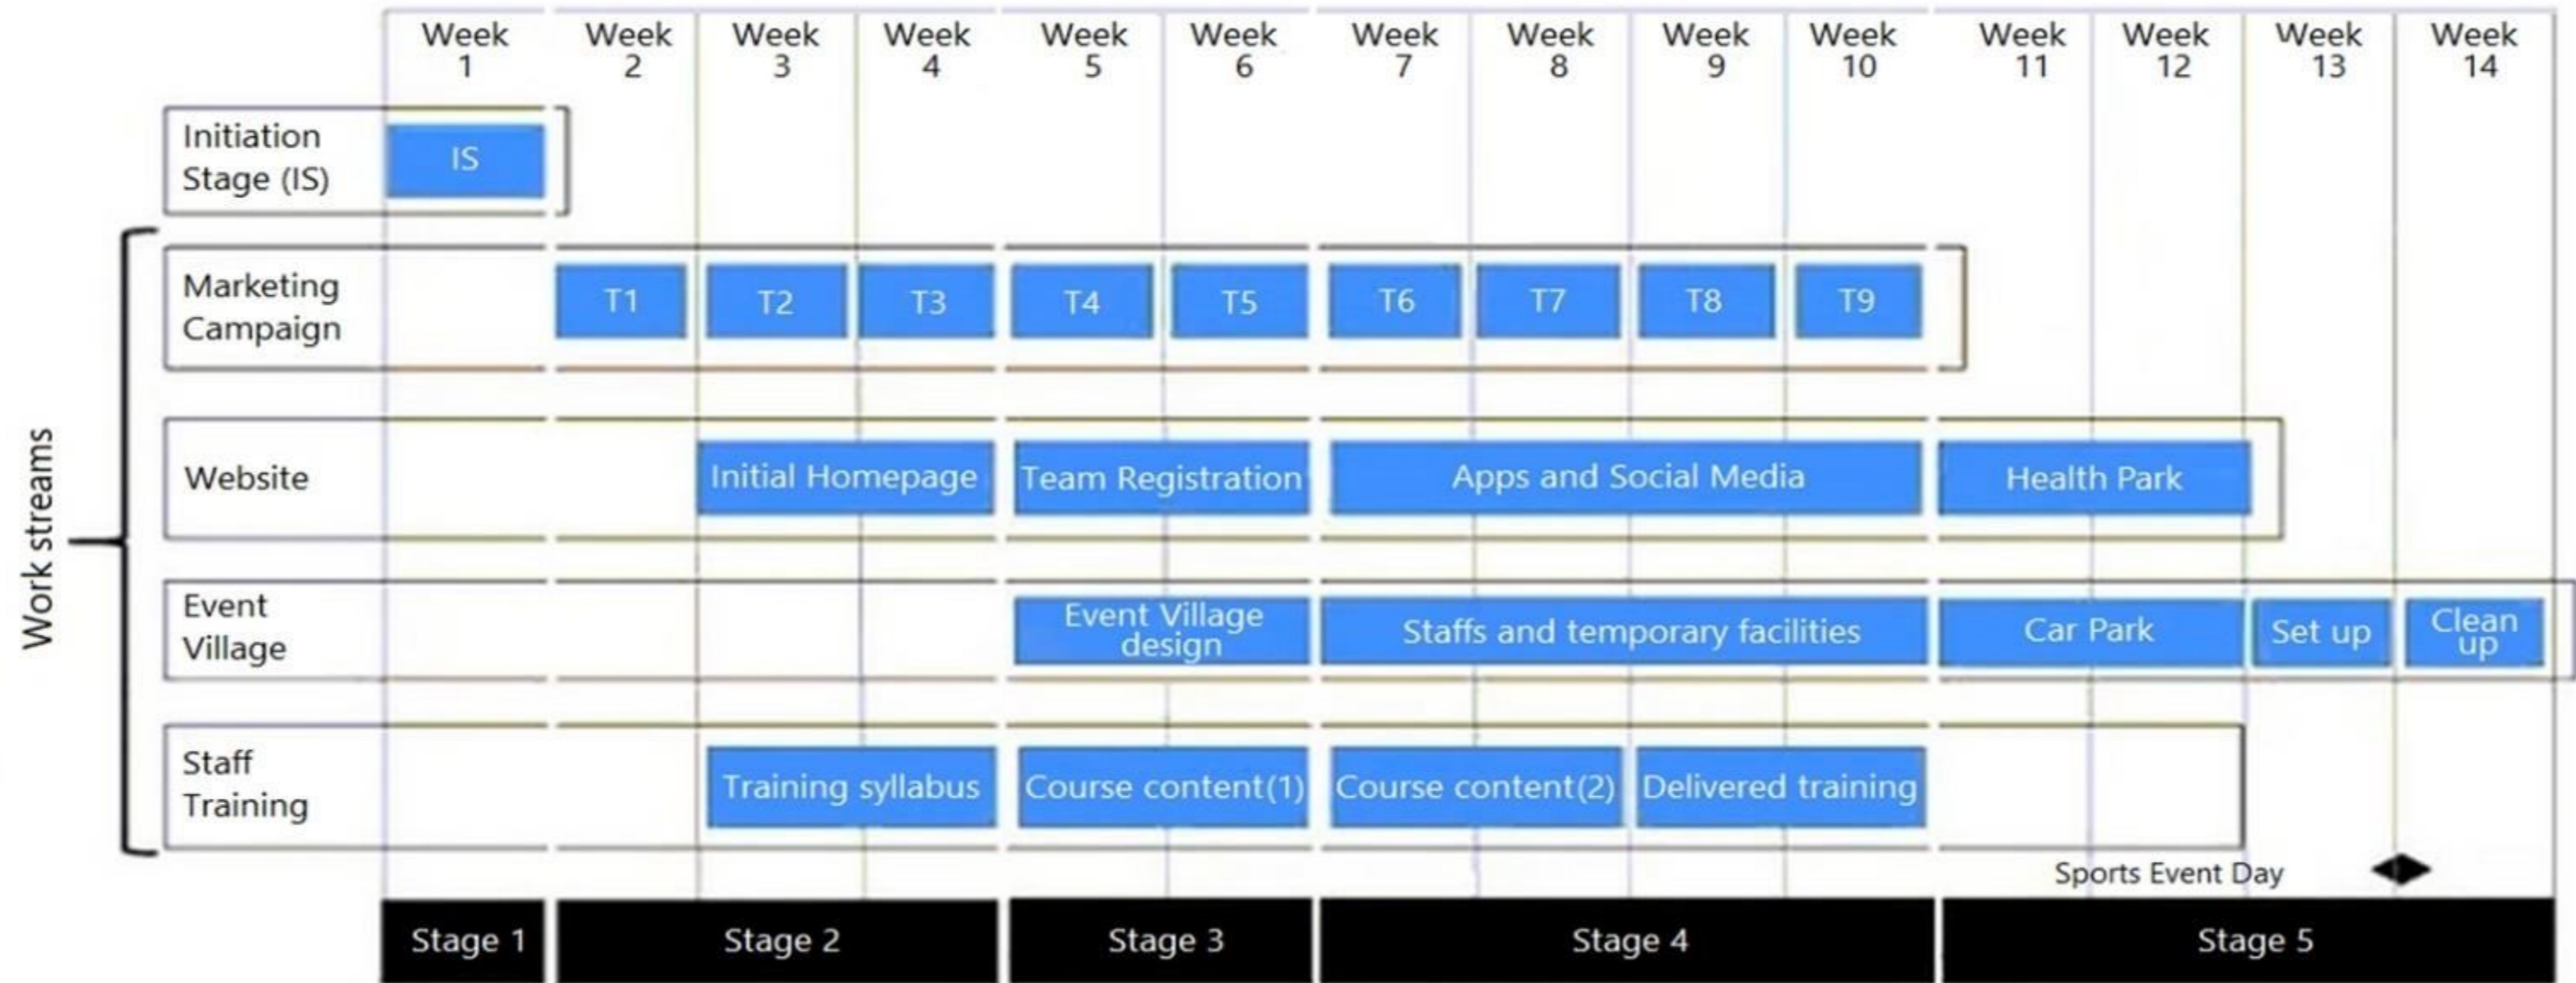

マーケティング - 追加情報

マーケティング キャンペーンでは、次の 2 つの主要な領域を宣伝します。

1. サッカートーナメント、イベントビレッジ、募金活動を含むイベント自体。
2. LGA の長期目標は、16 歳未満の子供たちの体力を向上させることです。

マーケティング チームは初期のスクラム トレーニングを受けましたが、それをマーケティング業務にどのように適用できるかはわかりません。

マーケティング チームは、キャンペーンに多くの時間を費やす前に、プロジェクト マネージャーがキャンペーンの明確な概要を提供することを強く望んでいます。

彼らはさまざまなマーケティング チャンネルでの作業経験を持っていますが、この種のイベント、特に LGA の長期的な健康目標を促進するためにどのチャンネルが最も効果的に機能するかはわかりません。

マーケティング チームは、イベントの 2 つの目的に割り当てる優先順位を明確にしていません。

マーケティング チームは毎週広告や販促資料を発行し、メッセージを最新の状態に保つために各号に詳しい情報を掲載します。

9 週間のタイムボックスのそれぞれの終了時に、9 つのリリースが予定されています。

マーケティング ワーク ストリーム内の 9 つのタイムボックスには、次の内容が含まれるようにスケジュールされています。

広告:

ラジオインタビュー;

配布物/チラシの作成

町中やイベント会場に掲示する横断幕や看板。

ウェブサイトおよびソーシャルメディアコンテンツの提供。

地元企業が掲示する宣伝ポスター。

プロジェクト シナリオとマーケティング追加情報を使用して、次の質問に答えます。

マーケティング チームは、Web サイト チームによって設定されている Web サイト ページに必要なすべての情報、写真、リンクが現在の期限内に配信できるかどうか確信がありません。

チーム メンバーの 1 人が、チームが定期的に LGA のカフェテリアを訪れ、他の部門のスタッフに Web サイト ページのラフな図面を見せてフィードバックを得ることを提案しました。これにより、各ページのどの部分を期限内に納品するのが最も重要かを判断するのに役立ちます。

このアプローチがどのように変化を管理するかを最もよく説明しているのはどれですか？

A. タイムボックスの高レベルでの変更はベースラインに影響を与えないため、これは良いアプローチです。

B. ウェブサイトの情報の変更はフィードバックに基づいて行われるべきなので、これは良いアプローチです。

C. 探索は変化を可能にするために創造的な環境を必要とする行動であるため、これは適切なアプローチではありません。

D. 一部の Web サイト ページを次のタイムボックスに移動する必要があるため、これは適切なアプローチではありません。

Answer: B (メッセージを残す)

ウェブサイト ページのラフ図面についてスタッフからフィードバックを求めることで、マーケティング チームは、どのコンテンツが最も価値があり、現在の期限内に優先して配信すべきかについて十分な情報に基づいた決定を下すことができます。この応答性の高いアプローチにより、チームはフィードバックに効果的に適応し、最終製品が関係者のニーズを満たすことを保証できます。

最新問題: 2

PRINCE2 Agile の 8 つのガイダンス ポイントと一致しているのはどれですか。

A. アジャイルな方法で作業すると、プロジェクト マネージャーが不要になります。

B. IT のみのフレームワークを組み込む場合、プロジェクト マネージャーの役割は必要ありません。

C. プロジェクト マネージャーの役割は、Scrum や Kanban では定義されません。

D. プロジェクト マネージャーは、「指揮統制」文化の典型です。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 3

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう！

(注シナリオ内の企業や人物は架空のものです)

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6 人制サッカー トーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16 歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGA の自己資金政策の一環として、これは LGA (したがって地元の納税者) の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツ センターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツ イベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカー トーナメントには、キッズ ゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベント ビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにある LGA 所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するためのウェブサイト。

家族でのお出かけをサポートするイベントビレッジ。

イベントの運営とサポートを行うボランティアとしてのLGAスタッフのトレーニング。

アプリケーションを処理するバックオフィスプロセス。

イベントの費用を賄うための募金活動。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の4つの作業ストリームで構成されています。


1. マーケティング
2. ウェブサイト
3. イベントビレッジ
4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGAはPRINCE2の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクトマネージャーはPRINCE2 Agileに完全に精通しています。町の中心にあるLGAビルの1つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクトマネージャーはすでにドアに「ミッションコントロール」と書かれた看板を掲げています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。

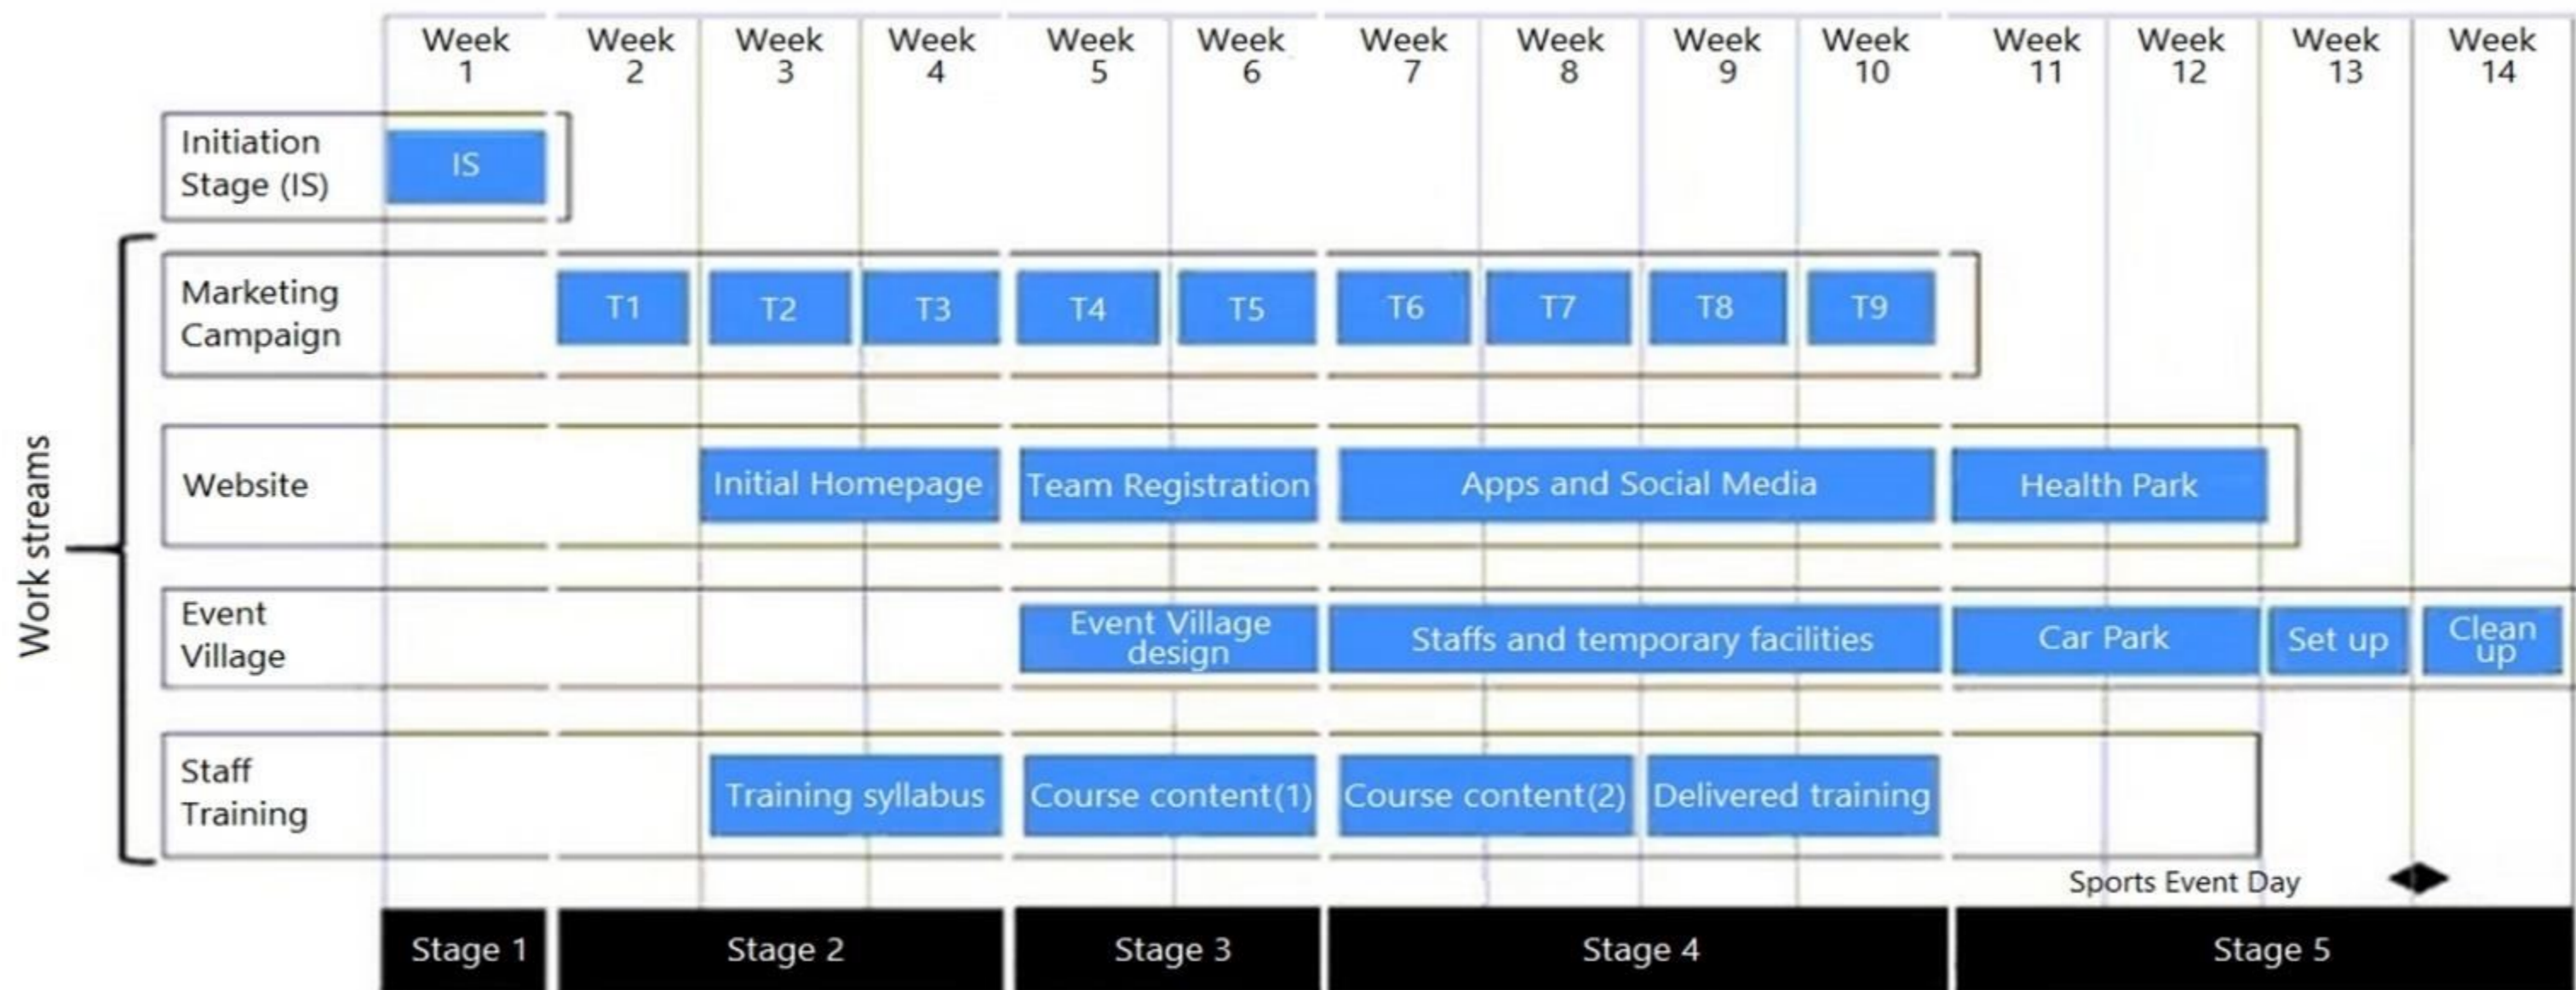

スタッフトレーニング - 追加情報

このイベントは主にLGAスタッフボランティアによって監督されます。彼らは以下のことを行えるよう、さまざまなスキルの訓練を受ける必要があります。

A. イベントは安全かつ専門的に実行されます。

B. スタッフが健康とフィットネスに関するアドバイスを提供できます。

これは4つの作業パッケージでカバーされます。

1. 研修シラバス:

* マニュアルの高レベルな設計。

* 各モジュールの内容。

2. 安全性と専門性に関するコース内容:

* 2つのモジュールの詳細設計:

* 基本的な応急処置を含む健康と安全。

* イベント参加者の対応を行うカスタマーリレーション。

* ボランティアのグループと一緒にモジュールを試験運用します。

3. 健康とフィットネスに関するアドバイスを提供するコース内容:

* 2つのモジュールの詳細設計:

- * ウォーミングアップやクールダウンの方法など、運動の基礎を学びます。
- * どのような種類の食べ物が健康に良いかなど、健康的な食事について。
- * ボランティアのグループと一緒にモジュールを試験運用します。

4. トレーニングの提供:

- * トレーニングマニュアルの作成
- * 残りのボランティアへのトレーニングの提供。

スタッフ トレーニング チームには、いくつかのウォーターフォール プロジェクトに参与してきたものの、アジャイルに触れたことのない社内トレーニング スタッフが配置されています。

プロジェクト シナリオとスタッフ トレーニングの追加情報を使用して、次の質問に答えます。

ストール トレーニング チームは、次のユーザー ストーリーを開発しました。

「LGA としては、イベントが一般の人々にとって安全な環境で行われるよう、すべてのボランティアが必須の健康と安全に関するトレーニングを受けることを望んでいます。」フットボール トーナメントの前に、この必須トレーニングを実施できる適切なトレーナーがいない可能性が高いです。

スタッフトレーニングチームは、5つの目標に従ってこのリスクをどのように管理すべきでしょうか？

- C. リスク許容度をゼロに設定し、期限に間に合うように適切なトレーナーをすぐに見つけることにプロジェクト委員会と合意します。
- D. このリスクに対する許容度を調整して、現在の確率レベルでプロジェクト委員会がリスクを受け入れられるように設定します。
- E. このリスクに関して高いリスク許容度を設定し、期限内に納品して期限に間に合うように状況を監視します。
- F. 時間通りに予算内で提供するために、健康と安全に関するトレーニングの提供を製品バックログから削除します。

Answer: B (メッセージを残す)

リスク許容度を柔軟にすることで、チームは現状を認識し、プロジェクト委員会はリスクを理解して受け入れることができます。このアプローチにより、バックログからトレーニングを削除するなどの急激な対策にすぐに頼ることなく、リスクを軽減するための潜在的なアクションについて情報に基づいた意思決定が容易になります。健康と安全のトレーニングの要件に焦点を当てながら、その実施に関する期待を管理します。

最新問題: 4

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう！

(注シナリオ内の企業や人物は架空のものです)

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6 人制サッカー トーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16 歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGA の自己資金政策の一環として、これは LGA (したがって地元の納税者) の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツ センターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツ イベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカー トーナメントには、キッズ ゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベント ビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにある LGA 所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するためのウェブサイト。

家族でのお出かけをサポートするイベントビレッジ。

イベントの運営とサポートを行うボランティアとしてのLGAスタッフのトレーニング。

アプリケーションを処理するバックオフィスプロセス。

イベントの費用を賄うための募金活動。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の4つの作業ストリームで構成されています。


1. マーケティング
2. ウェブサイト
3. イベントビレッジ
4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGAはPRINCE2の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクトマネージャーはPRINCE2 Agileに完全に精通しています。町の中心にあるLGAビルの1つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクトマネージャーはすでにドアに「ミッションコントロール」と書かれた看板を掲げています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。

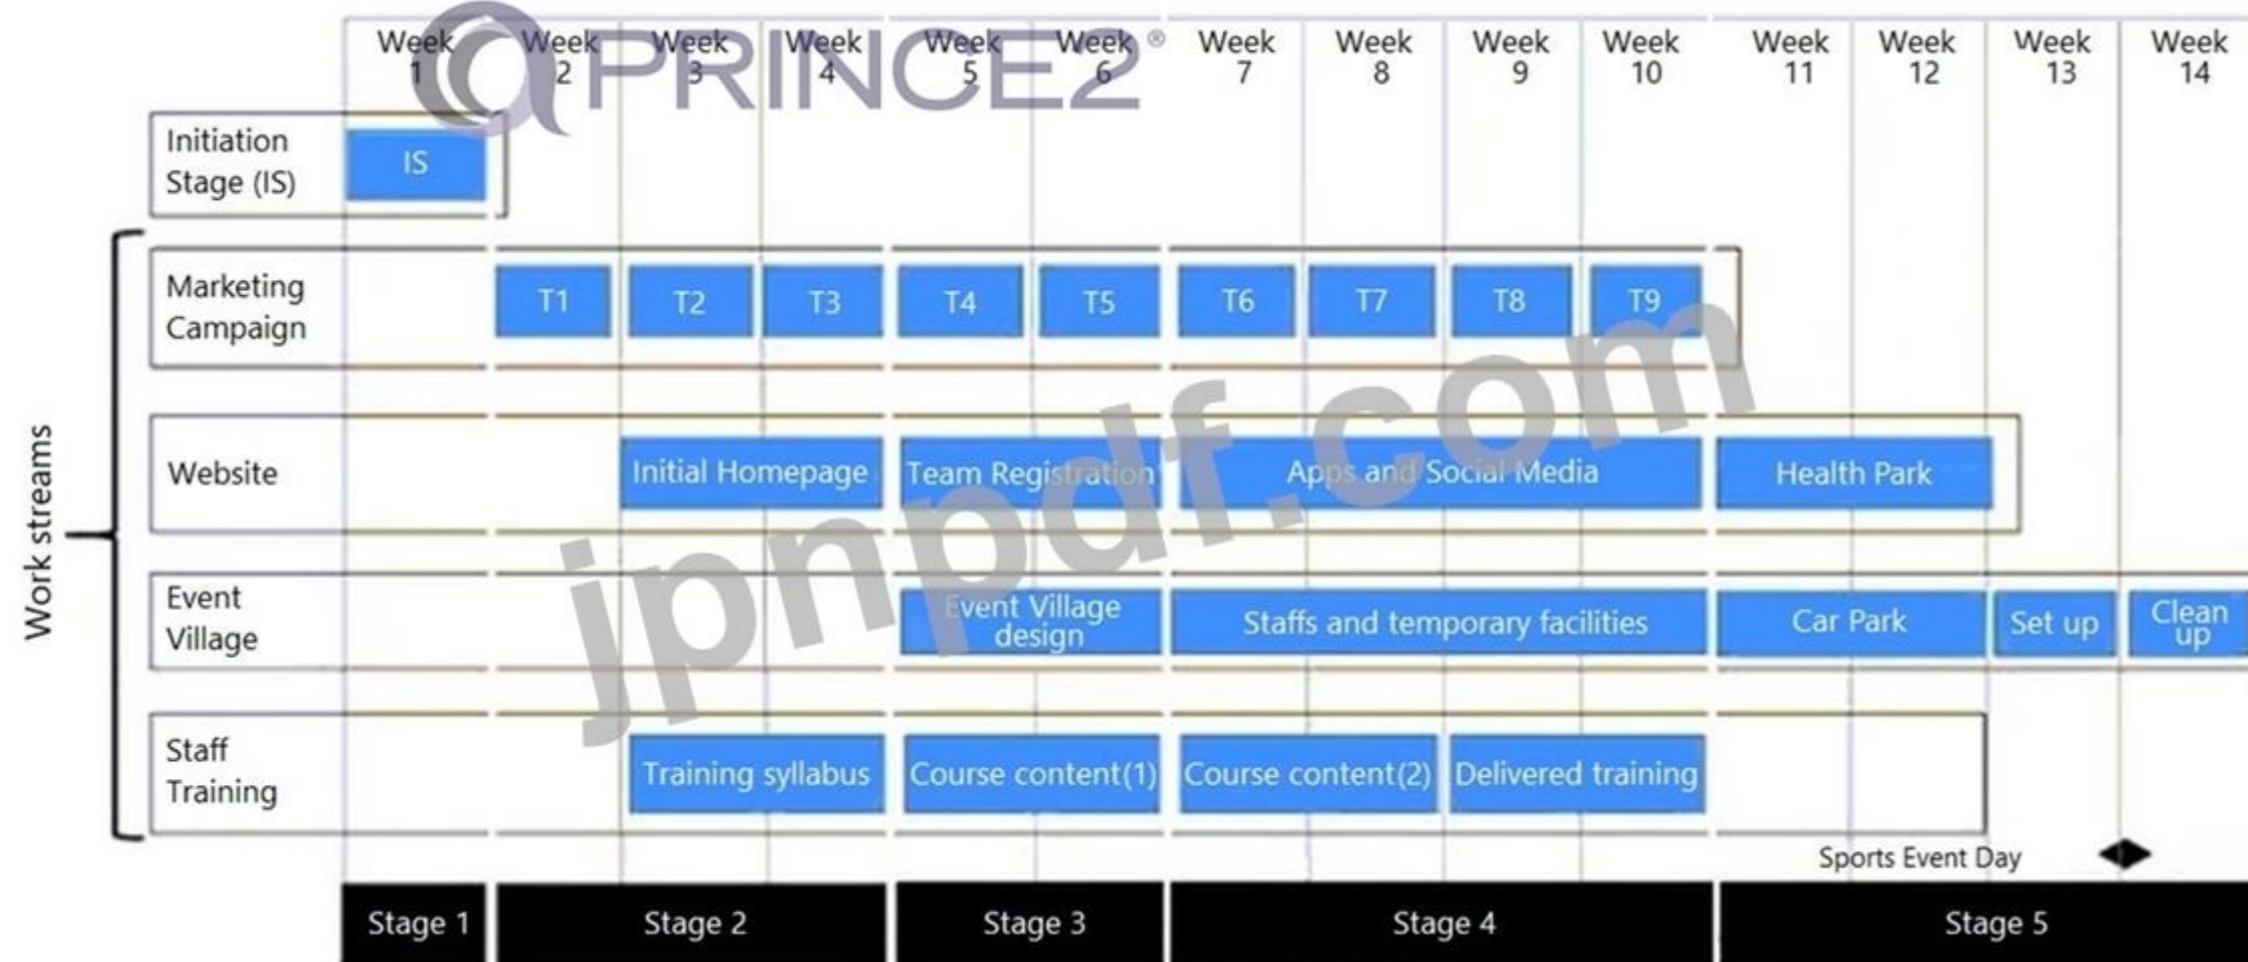

ウェブサイト - 追加情報

イベント用に新しいWebサイトが構築されます。この製品には5つの作業パッケージがあります。

1. 最初のホームページ:

イベントの詳細や競技ルールなどを掲載したウェブサイト。

2. チーム登録機能:

チーム名、選手名、年齢

連絡先;

支払い;

ランチパックの要件（特別な食事要件を含む）

駐車場の要件。

3. イベントとその目的を宣伝するソーシャル メディア。

4. フィットネスや健康的な食事のアプリなど、健康的なライフスタイルを促進するアプリケーション（アプリ）。

5. ヘルスパーク：

ディスカッション フォーラムを含む、健康的なライフスタイルに関するオンライン ナレッジ ベース。

ウェブサイト チームは IT 分野で豊富な経験があり、数年間アジャイルを使用しています。彼らは 5 つの 2 週間のタイムボックスを通じてウェブサイトを提供しています。チームはスクラム マスターを使用してスクラム プロセスを促進し、それに応じて人々を指導しています。

ウェブサイト チームはスクラムに非常に長けています。彼らはより困難な作業を評価するための一連のタスクを作成し、これをスプリント 0 と呼んでいます。

プロジェクト シナリオと Web サイトの追加情報を使用して、次の質問に答えます。

スクラム マスターは、サプライヤーの専門家から、ソーシャル メディア Web サイトを構築する 5 日間のタスクがほぼ完了しており、あと 1 日の作業が残っているという通知を受けました。

これをバーンダウンチャートでどのように表示すればよいでしょうか？

A. 残りの作業は、完了した作業と残っている作業の差になります。

B. 残り 1 日分の作業のみであるため、タスクは 80% 完了として表示されます。

C. 残っている作業量が 1 日分未満であるため、タスクはほぼ完了としてマークする必要があります。

D. タスクが完了するまでタスクを更新しないでください。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

バーンダウン チャートは、残っている作業の現在のステータスを正確に反映する必要があります。残っている作業は 1 日分未満であるため、タスクをほぼ完了としてマークすると、進捗状況がより明確になり、タスクを完了するのに必要な労力をチームが理解しやすくなります。このアプローチにより、進捗状況の透明性と効果的な追跡が促進されます。

最新問題: 5

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう！

（注シナリオ内の企業や人物は架空のものです）

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6 人制サッカー トーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16 歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGA の自己資金政策の一環として、これは LGA (したがって地元の納税者) の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツ センターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツ イベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカー トーナメントには、キッズ ゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベント ビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにある LGA 所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するためのウェブサイト、家族でのお出かけをサポートするイベント ビレッジ、イベントの運営とサポートを行うボランティアとしての LGA スタッフのトレーニング、申し込みを処理するバック オフィス プロセス、イベントの費用を賄うための資金調達。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の 4 つの作業ストリームで構成されています。

1. マーケティング

2. ウェブサイト

3. イベントビレッジ


4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGA は PRINCE2 の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクト マネージャーは PRINCE2 Agile に完全に精通しています。町の中心にある LGA ビルの 1 つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクト マネージャーはすでにドアに「ミッションコントロール」と書かれた看板を掲げています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。

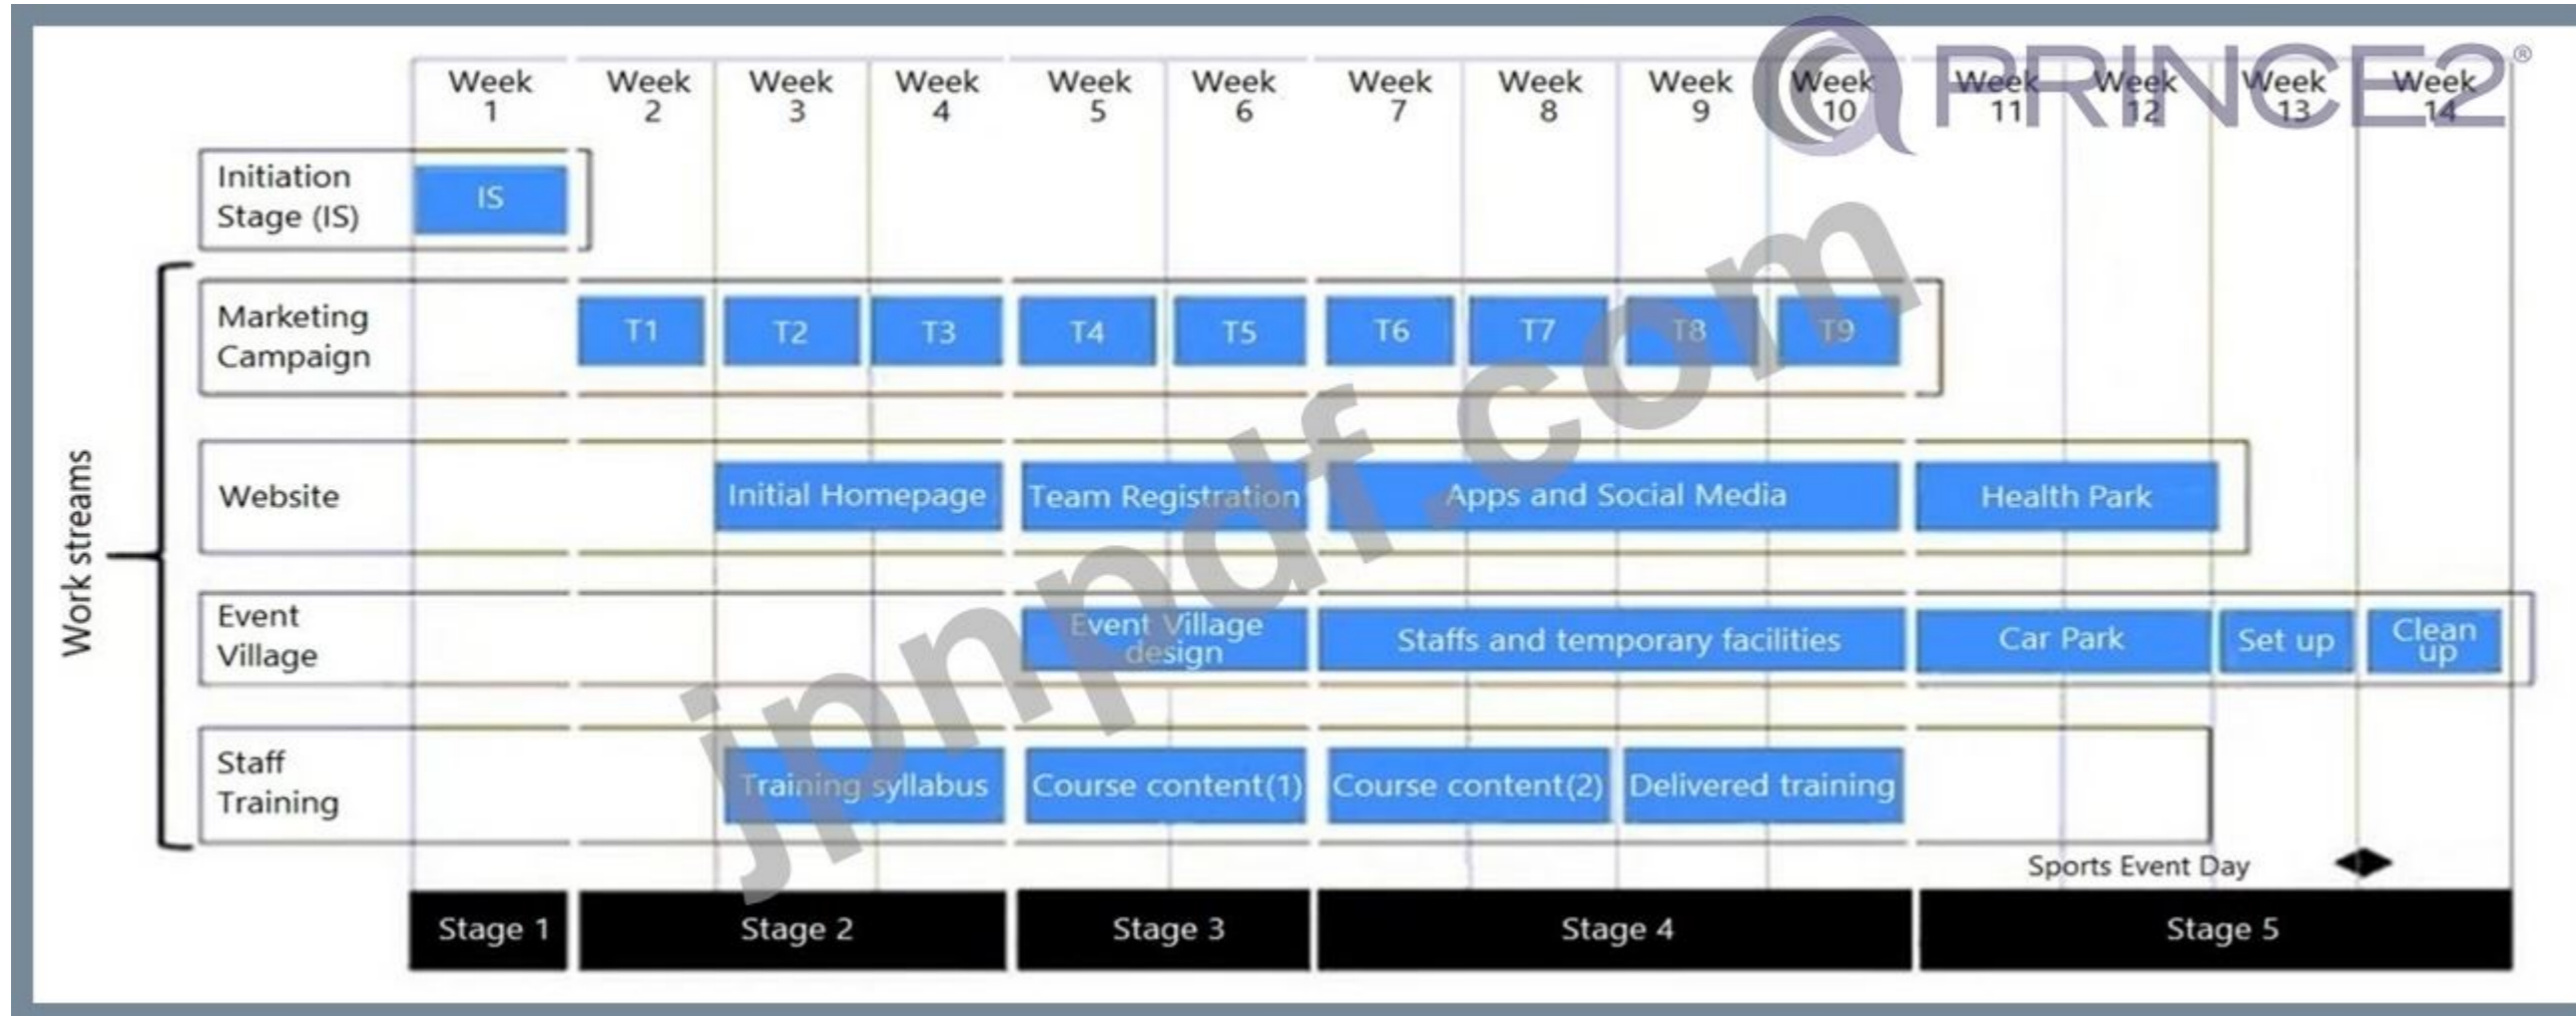

スタッフトレーニング - 追加情報

このイベントは主にLGAスタッフボランティアによって監督されます。彼らは以下のことを行えるよう、さまざまなスキルの訓練を受ける必要があります。

A. イベントは安全かつ専門的に実行されます。

B. スタッフが健康とフィットネスに関するアドバイスを提供できます。

これは 4 つの作業パッケージでカバーされます。

1. 研修シラバス:

* マニュアルの高レベルな設計。

* 各モジュールの内容。

2. 安全性と専門性に関するコース内容:

* 2つのモジュールの詳細設計:

* 基本的な応急処置を含む健康と安全。

* イベント参加者の対応を行うカスタマーリレーション。

* ボランティアのグループと一緒にモジュールを試験運用します。

3. 健康とフィットネスに関するアドバイスを提供するコース内容:

* 2つのモジュールの詳細設計:

* ウォーミングアップやクールダウンの方法など、運動の基礎を学びます。

* どのような種類の食べ物が健康に良いかなど、健康的な食事について。

* ボランティアのグループと一緒にモジュールを試験運用します。

4. トレーニングの提供:

* トレーニングマニュアルの作成

* 残りのボランティアへのトレーニングの提供。

スタッフ トレーニング チームには、いくつかのウォーターフォール プロジェクトに参与してきたものの、アジャイルに触れたことのない社内トレーニング スタッフが配置されています。

プロジェクト シナリオとスタッフ トレーニングの追加情報を使用して、次の質問に答えます。

LGA のソーシャル メディア 専門家は、LGA がすでに使用しているいくつかのソーシャル メディア チャンネルのトラフィックが、利用可能な他の多くのチャンネルよりもはるかに多いとアドバイスしています。

しかし、顧客の専門家は、健康とフィットネスのメッセージを宣伝するために、さまざまなソーシャル メディア チャンネルに参加することを要求しました。

チーム マネージャーが 5 つのターゲットに従って最も人気のあるソーシャル メディア チャンネルでの配信に重点を置く必要がある理由は何ですか。

C. チーム マネージャーは配信の障害を取り除く必要があるため、ターゲットに適切に適用されます。

D. 各タイムボックスで関連するスキルが利用可能であるため、ターゲットが適切に適用されます。

E. LGA はステージ 3 中に健康と安全の専門家にアクセスできないため、目標が適切に適用されません。

F. 進捗を改善するためにステージ 2 で CSME を追加する必要があったため、ターゲットが適切に適用されていません。

Answer: D (メッセージを残す)

最も人気のあるソーシャル メディア チャンネルに集中することで、健康とフィットネスに関するメッセージの潜在的なリーチとエンゲージメントが最大化されます。これらのチャンネルを優先することで、チームは効果的にディスカッションや交流を促進し、リソースを効率的に活用しながら、イニシアチブに対する認知度と関心を高めるという目標に沿うことができます。

最新問題: 6

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう！

(注シナリオ内の企業や人物は架空のものです)

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6 人制サッカー トーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16 歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGA の自己資金政策の一環として、これは LGA (したがって地元の納税者) の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツ センターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツ イベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカー トーナメントには、キッズ ゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベント ビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにある LGA 所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するためのウェブサイト。

家族でのお出かけをサポートするイベントビレッジ。

イベントの運営とサポートを行うボランティアとしてのLGAスタッフのトレーニング。

アプリケーションを処理するバックオフィスプロセス。

イベントの費用を賄うための募金活動。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の4つの作業ストリームで構成されています。


1. マーケティング
2. ウェブサイト
3. イベントビレッジ
4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGAはPRINCE2の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクトマネージャーはPRINCE2 Agileに完全に精通しています。町の中心にあるLGAビルの1つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクトマネージャーはすでにドアに「ミッションコントロール」と書かれた看板を掲げています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。

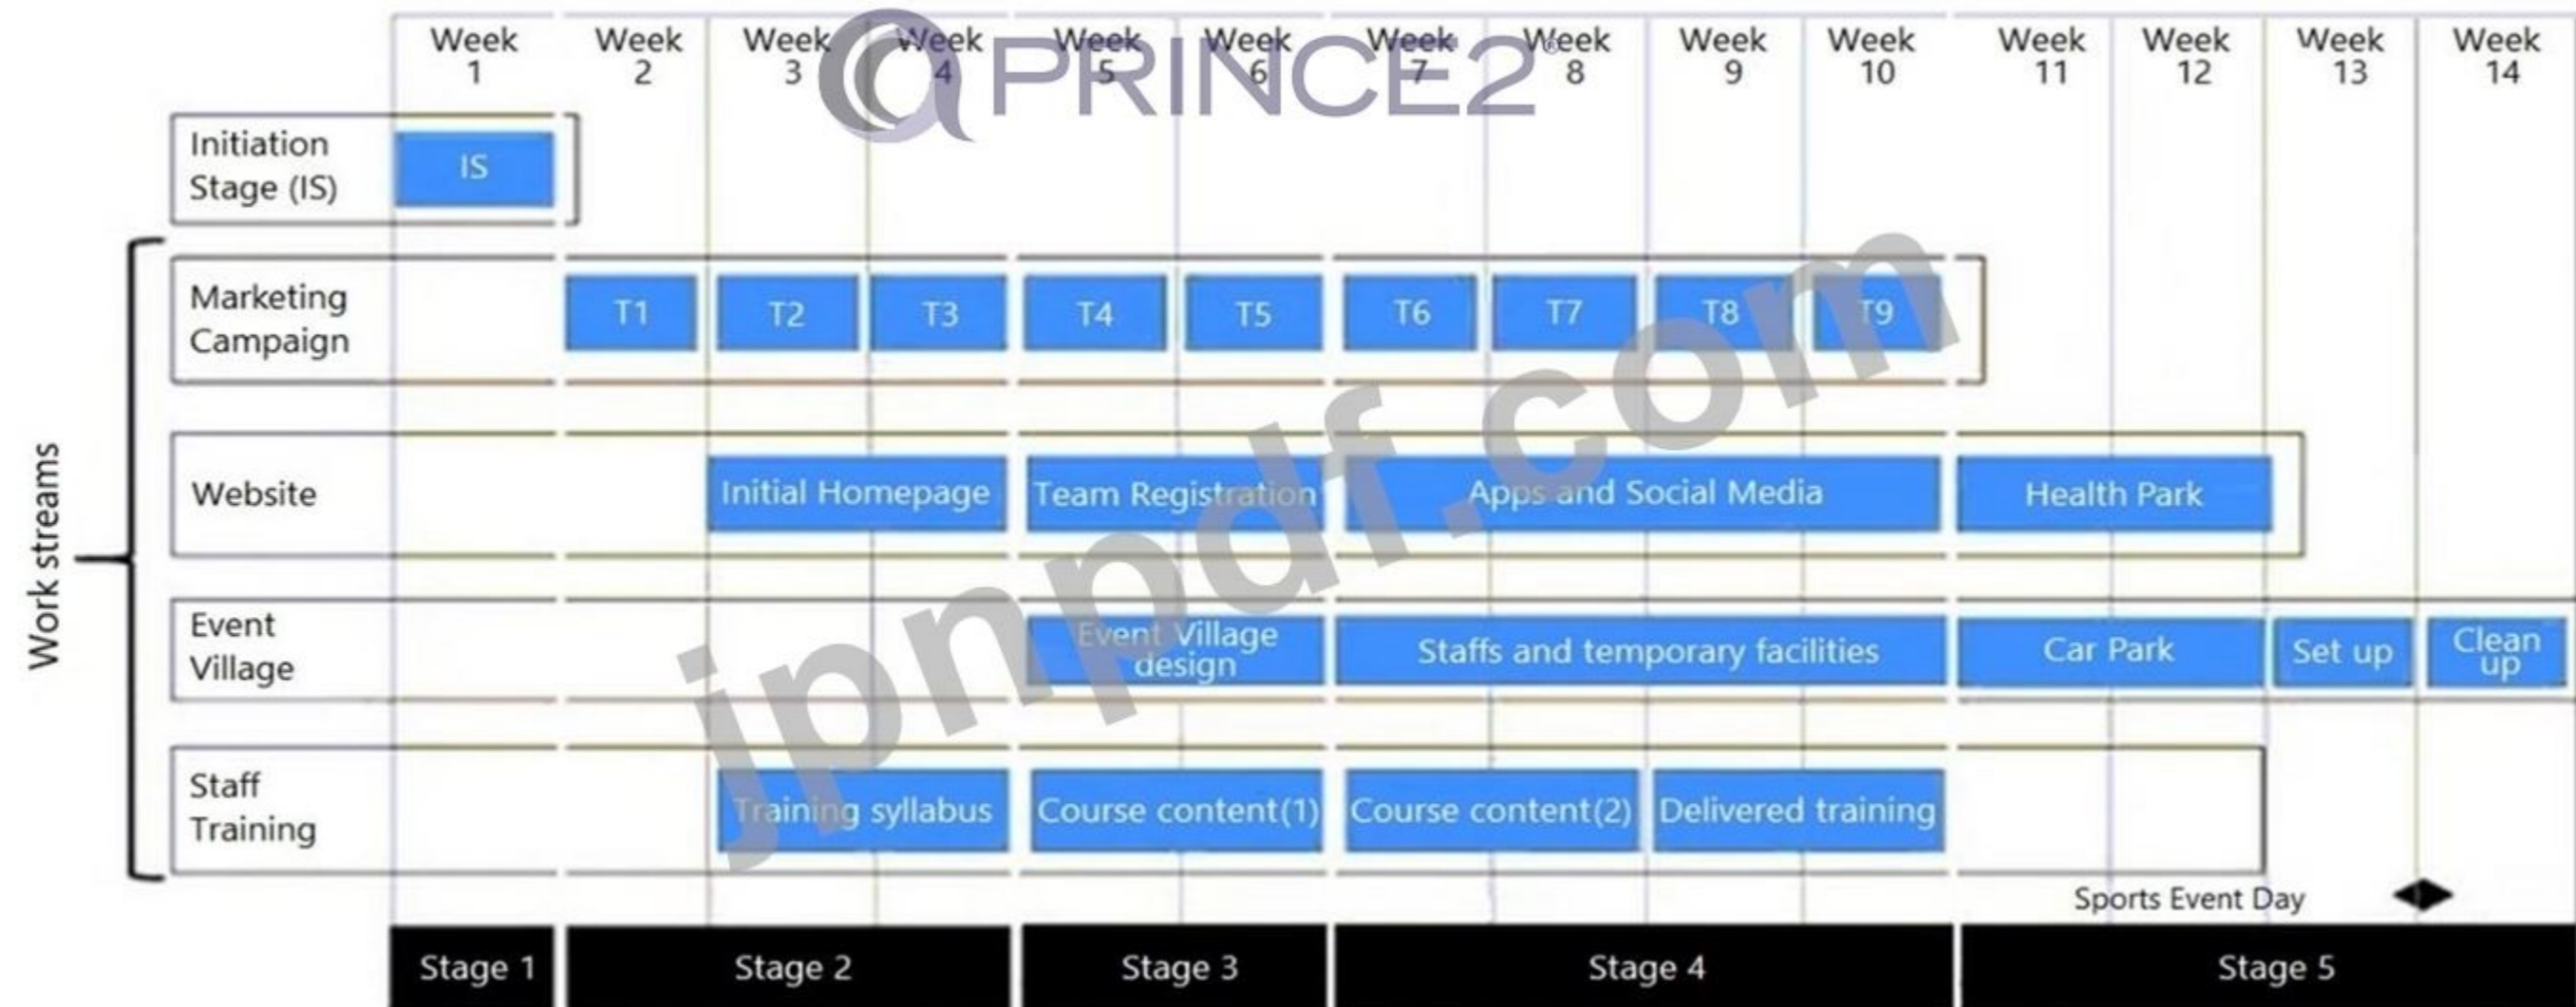

スタッフトレーニング - 追加情報

このイベントは主にLGAスタッフボランティアによって監督されます。彼らは以下のことを行えるよう、さまざまなスキルの訓練を受ける必要があります。

- A. イベントは安全かつ専門的に実行されます。
- B. スタッフが健康とフィットネスに関するアドバイスを提供できます。

これは4つの作業パッケージでカバーされます。

1. 研修シラバス:

- * マニュアルの高レベルな設計。
- * 各モジュールの内容。

2. 安全性と専門性に関するコース内容:

- * 2つのモジュールの詳細設計:

- * 基本的な応急処置を含む健康と安全。
- * イベント参加者の対応を行うカスタマーリレーション。
- * ボランティアのグループと一緒にモジュールを試験運用します。

3. 健康とフィットネスに関するアドバイスを提供するコース内容:

- * 2つのモジュールの詳細設計:

- * ウォーミングアップやクールダウンの方法など、運動の基礎を学びます。
- * どのような種類の食べ物が健康に良いかなど、健康的な食事について。
- * ボランティアのグループと一緒にモジュールを試験運用します。

4. トレーニングの提供:

- * トレーニングマニュアルの作成

- * 残りのボランティアへのトレーニングの提供。

スタッフ トレーニング チームには、いくつかのウォーターフォール プロジェクトに参与してきたものの、アジャイルに触れたことのない社内トレーニング スタッフが配置されています。

プロジェクト シナリオとスタッフ トレーニングの追加情報を使用して、次の質問に答えます。

スタッフトレーニングチームは、次のユーザーストーリーを開発しました。

「LGA として、イベントが一般の人々にとって安全な環境で行われるように、すべてのボランティアが必須の健康と安全のトレーニングを受けるようにしたいと考えています。」チームが「時間どおりに期限を守る」という目標に従ってユーザー ストーリーを提供する必要がある理由は何ですか。

C. ボランティアが健康と安全の要件を理解できるようにトレーニングを実施する必要があります。

D. 計画されているサッカートーナメントが開催される前に、健康と安全に関するトレーニングを実施する必要があります。

E. ボランティアは、トレーニングを安全に適用できるようになるまで、時間をかけてトレーニングを理解します。

F. 健康と安全に関するトレーニングは、サッカーのトーナメント前に実施できない場合は省略する必要があります。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

健康と安全に関するトレーニングをタイムリーに実施することは、イベント前にすべてのボランティアが十分な準備を整えるために不可欠です。この期限を守ることは、サッカー トーナメント中に一般の人々に安全な環境を提供するために不可欠であり、スケジュールを順守することが最優先事項となります。

最新問題: 7

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう！

(注シナリオ内の企業や人物は架空のものです)

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6 人制サッカー トーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16 歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGA の自己資金政策の一環として、これは LGA (したがって地元の納税者) の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツ センターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツ イベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカー トーナメントには、キッズ ゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベント ビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにある LGA 所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するためのウェブサイト、家族でのお出かけをサポートするイベント ビレッジ、イベントの運営とサポートを行うボランティアとしての LGA スタッフのトレーニング、申し込みを処理するバック オフィス プロセス、イベントの費用を賄うための資金調達。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の 4 つの作業ストリームで構成されています。


1. マーケティング
2. ウェブサイト
3. イベントビレッジ
4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGA は PRINCE2 の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクト マネージャーは PRINCE2 Agile に完全に精通しています。町の中心部にある LGA ビルの 1 つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクト マネージャーはすでにドアに「ミッション コントロール」と書かれた看板を設置しています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。

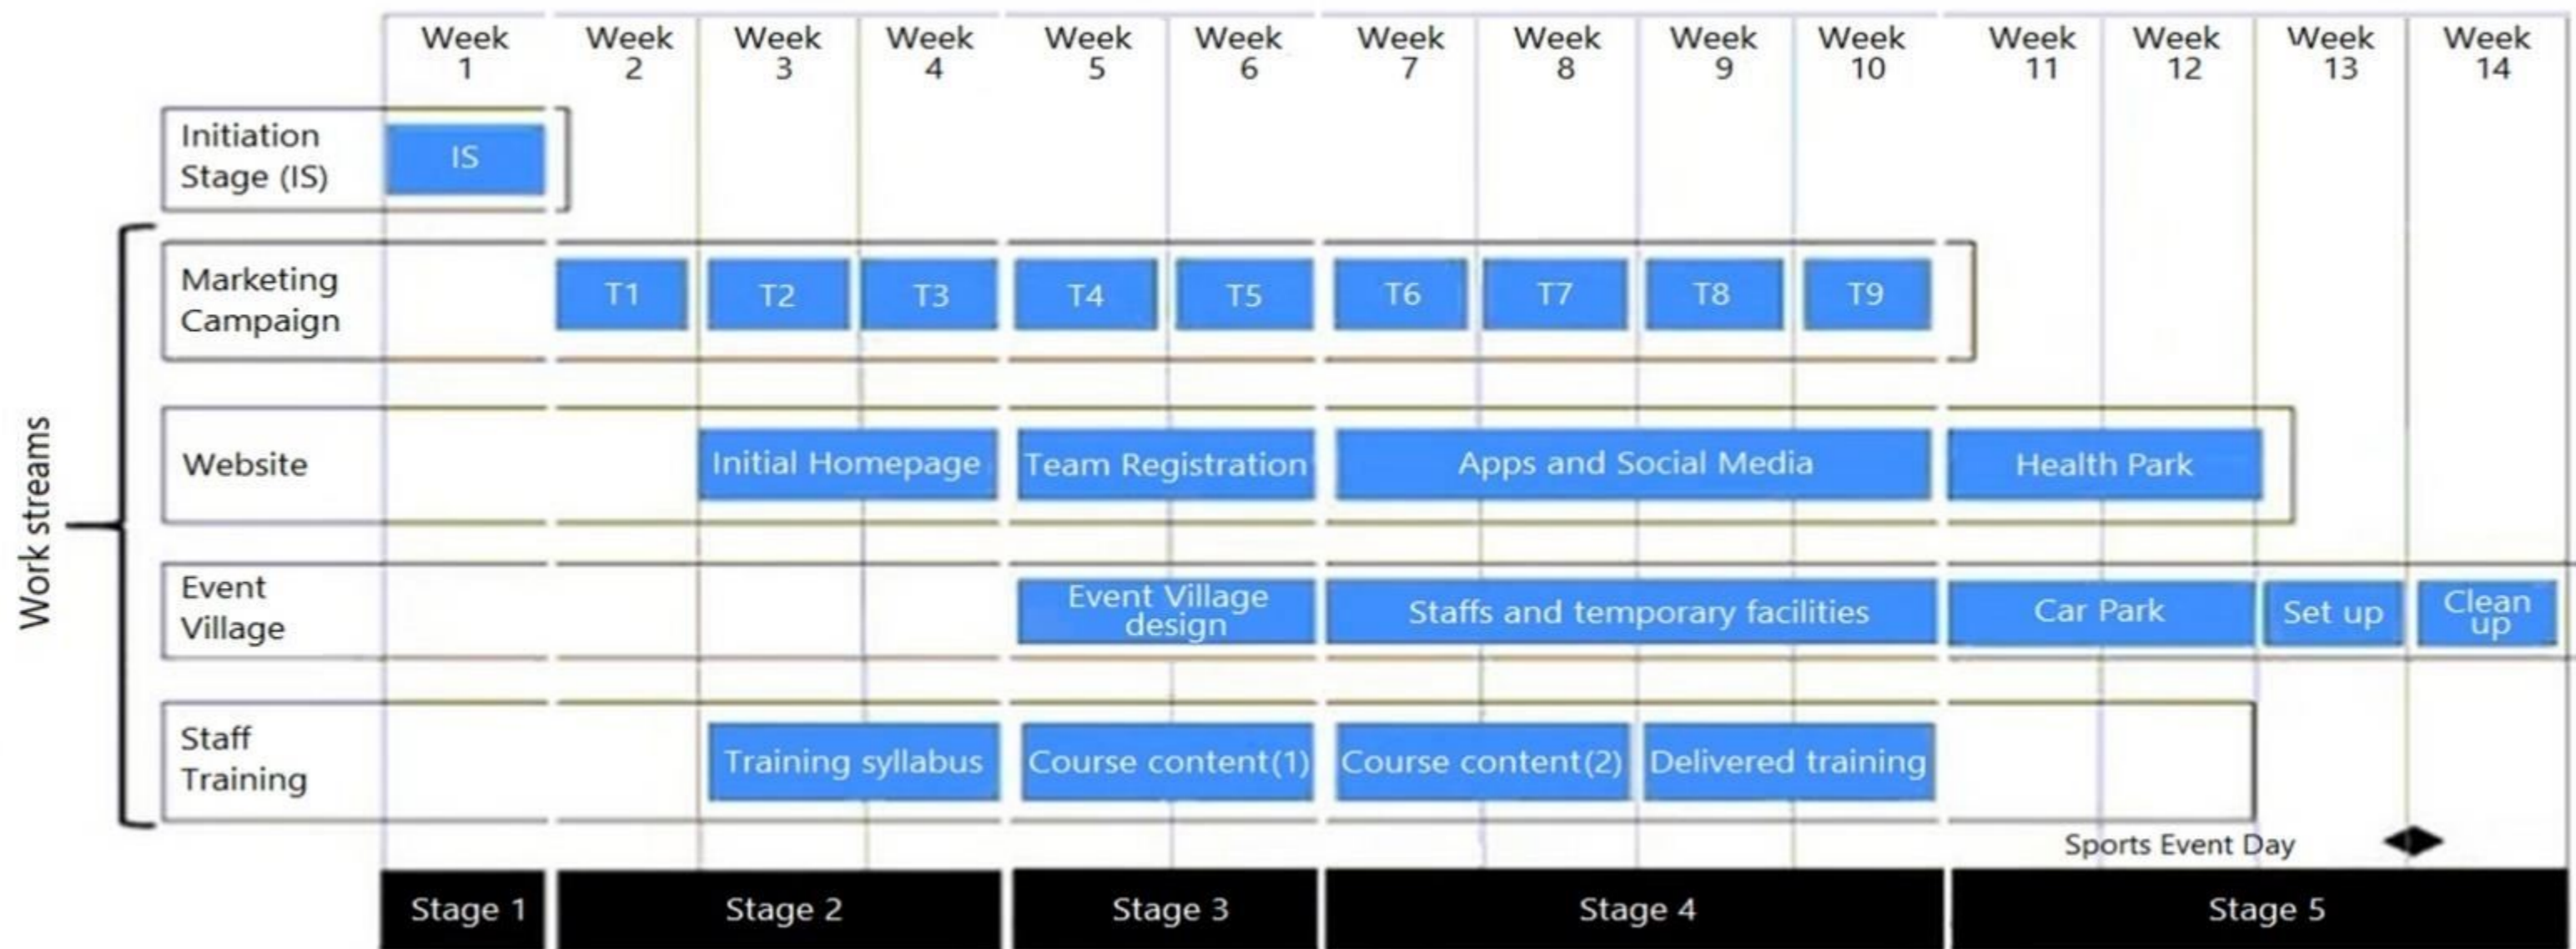

ウェブサイト - 追加情報

イベント用に新しい Web サイトが構築されます。この製品には 5 つの作業パッケージがあります。

1. 最初のホームページ:

イベントの詳細や競技ルールなどを掲載したウェブサイト。

2. チーム登録機能:

チーム名、選手名、年齢

連絡先;

支払い;

ランチパックの要件 (特別な食事要件を含む)

駐車場の要件。

3. イベントとその目的を宣伝するソーシャルメディア。

4. フィットネスや健康的な食事のアプリなど、健康的なライフスタイルを促進するアプリケーション (アプリ)。

5. ヘルスパーク :

ディスカッション フォーラムを含む、健康的なライフスタイルに関するオンラインナレッジベース。

ウェブサイトチームはIT分野で豊富な経験があり、数年間アジャイルを使用しています。彼らは5つの2週間のタイムボックスを通じてウェブサイトを提供しています。チームはスクラム マスターを使用してスクラム プロセスを促進し、それに応じて人々を指導しています。

ウェブサイトチームはスクラムに非常に長けています。彼らはより困難な作業を評価するための一連のタスクを作成し、これをスプリント0と呼んでいます。

プロジェクトシナリオとWebサイトの追加情報を使用して、次の質問に答えます。

「プロジェクトの開始」プロセス中に最初に次の評価が行われました。

ウェブサイトチームはすでにScrumを使用しており、このチームはアジャイル手法に精通していると予想されます。しかし、スタッフ トレーニング チームはアジャイルな作業方法にあまり精通していません。」この評価の結果、スタッフ トレーニング チームにアジャイル手法のトレーニングが提供されました。

「プロジェクトの終了」プロセスの一環として、次のような観察が行われました。

スタッフ トレーニング チームは、プロジェクトがステージ3に進むにつれて、何を修正し、何を調整するかについて理解を深めました。」なぜこの観察結果が最終プロジェクト レポートに記載される必要があるのでしょうか。

A. プロジェクト終了レポートでは、各タイムボックスとステージの結果をまとめる必要があります。

B. プロジェクト終了レポートでは、残りの「できたかもしれないこと」を運用スタッフに引き渡す必要があります。

C. プロジェクト終了レポートでは、Agilometerの使用とアジャイルな作業方法を確認する必要があります。

D. プロジェクト終了レポートでは、プロジェクトによってどの程度の範囲が達成されたかを確認する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

この観察は、プロジェクトの進行に伴ってスタッフ トレーニング チームのアジャイル手法に対する理解が向上したことを強調しており、これは提供されたトレーニングの有効性やチームがアジャイル プラクティスにどれだけ適応したかを評価することに関連しています。これを最終プロジェクト レポートに含めることで、組織内でのアジャイル機能の開発に対するプロジェクトの貢献が強調されます。

最新問題: 8

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう！

(注シナリオ内の企業や人物は架空のものです)

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6人制サッカー トーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGAの自己資金政策の一環として、これはLGA(したがって地元の納税者)の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツ センターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツ イベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカー トーナメントには、キッズ ゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベント ビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにあるLGA所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するためのウェブサイト、家族でのお出かけをサポートするイベント ビレッジ、イベントの運営とサポートを行うボランティアとしてのLGAスタッフのトレーニング、申し込みを処理するバック オフィス プロセス、イベントの費用を賄うための資金調達。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の4つの作業ストリームで構成されています。

1. マーケティング

2. ウェブサイト

3. イベントビレッジ

4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGA は PRINCE2 の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクト マネージャーは PRINCE2 Agile に完全に精通しています。町の中心部にある LGA ビルの 1 つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクト マネージャーはすでにドアに「ミッション コントロール」と書かれた看板を設置しています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。



ウェブサイト - 追加情報

イベント用に新しい Web サイトが構築されます。この製品には 5 つの作業パッケージがあります。

1. 最初のホームページ:

イベントの詳細や競技ルールなどを掲載したウェブサイト。

2. チーム登録機能:

チーム名、選手名、年齢

連絡先;

支払い;

ランチパックの要件 (特別な食事要件を含む)

駐車場の要件。

3. イベントとその目的を宣伝するソーシャルメディア。

4. フィットネスや健康的な食事のアプリなど、健康的なライフスタイルを促進するアプリケーション (アプリ)。

5. ヘルスパーク :

ディスカッション フォーラムを含む、健康的なライフスタイルに関するオンライン ナレッジ ベース。

ウェブサイト チームは IT 分野で豊富な経験があり、数年間アジャイルを使用しています。彼らは 5 つの 2 週間のタイムボックスを通じてウェブサイトを提供しています。チームはスクラム マスターを使用してスクラム プロセスを促進し、それに応じて人々を指導しています。

ウェブサイト チームはスクラムに非常に長けています。彼らはより困難な作業を評価するための一連のタスクを作成し、これをスプリント 0 と呼んでいます。

プロジェクト シナリオと Web サイトの追加情報を使用して、次の質問に答えます。

ステージ 4 のアプリとソーシャル メディアのタイムボックス中に、LGA は、緊急の問題を解決するために、顧客の専門家が運用作業に戻ることを許可するよう要求しました。この要求は、幹部によってうまく拒否されました。

その後の回顧では、次のような観察がなされました。

「スプリント中のウェブサイトチームの安定性は、すべての必須項目の配信と、4 つの すべきこと」

この観察をどのように捉えるべきでしょうか？

A. 振り返り後のプロジェクト マネージャーによる日次ログ。

B. バーンダウン チャートとともに生成されるハイライト レポート。

C. チームの不安定性に関連するリスクのレベルを反映するリスク レジスタ。

D. チーム情報ラジエーターに表示されるレッスンログ。

Answer: D (メッセージを残す)

レッスン ログは、振り返りから得た洞察と反省を記録する場所であり、チームが過去の経験を確認してそこから学ぶためにアクセスできるようにします。この観察をそこに文書化することで、配信を成功させるにはチームの安定性が重要であることが強調され、将来の実践と決定に役立てることができます。

最新問題: 9

通常業務 (BAU) の特徴を説明するものはどれですか。

A. 既存製品の寿命中に定期的に行われる定期的な変更のリスト。)

B. 特定の問題または機会に対処するために選ばれた新しいチーム。

C. 一緒に管理される困難なタスクの集合。

D. より大きな作業プログラムの一部である配信。

Answer: A (メッセージを残す)

日常業務: BAU には、組織の日常業務に必要な標準的な活動とプロセスが含まれます。これには、サービス、製品、および全体的な業務を維持するために定期的かつ一貫して実行されるタスクが含まれます。

定期的な変更: BAU 作業には、既存の製品やサービスに対する小さな更新や変更が含まれることがよくあります。これらの変更は通常、効率性の向上、問題の解決、または大きな混乱を招かずに環境の変化に適応することを目的としています。

メンテナンスとサポート: BAU には、システムの監視、顧客サポートの提供、規制への準拠の確保などのメンテナンス タスクが含まれます。これらのタスクにより、既存の製品とサービスが引き続き効果的に機能することが保証されます。

予測可能で構造化されている: 開始日と終了日が定義されているプロジェクトとは異なり、BAU 作業は継続的であり、確立された手順に従う傾向があります。この予測可能性により、組織はリソースを効果的に管理できます。

安定性に重点を置く: BAU 作業の目標は、組織内の安定性を維持することです。ある程度の変更 (定期的な変更など) を伴う場合もありますが、主な焦点は、既存の業務がスムーズに実行されるようにすることにあります。

最新問題: 10

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう！

(注シナリオ内の企業や人物は架空のものです)

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6 人制サッカー トーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16 歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGA の自己資金政策の一環として、これは LGA (したがって地元の納税者) の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツ センターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツ イベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカー トーナメントには、キッズ ゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベント ビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにある LGA 所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するためのウェブサイト、家族でのお出かけをサポートするイベント ビレッジ、イベントの運営とサポートを行うボランティアとしての LGA スタッフのトレーニング、申し込みを処理するバック オフィス プロセス、イベントの費用を賄うための資金調達。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の 4 つの作業ストリームで構成されています。


1. マーケティング
2. ウェブサイト
3. イベントビレッジ
4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGA は PRINCE2 の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクト マネージャーは PRINCE2 Agile に完全に精通しています。町の中心にある LGA ビルの 1 つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクト マネージャーはすでにドアに「ミッション コントロール」と書かれた看板を掲げています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。

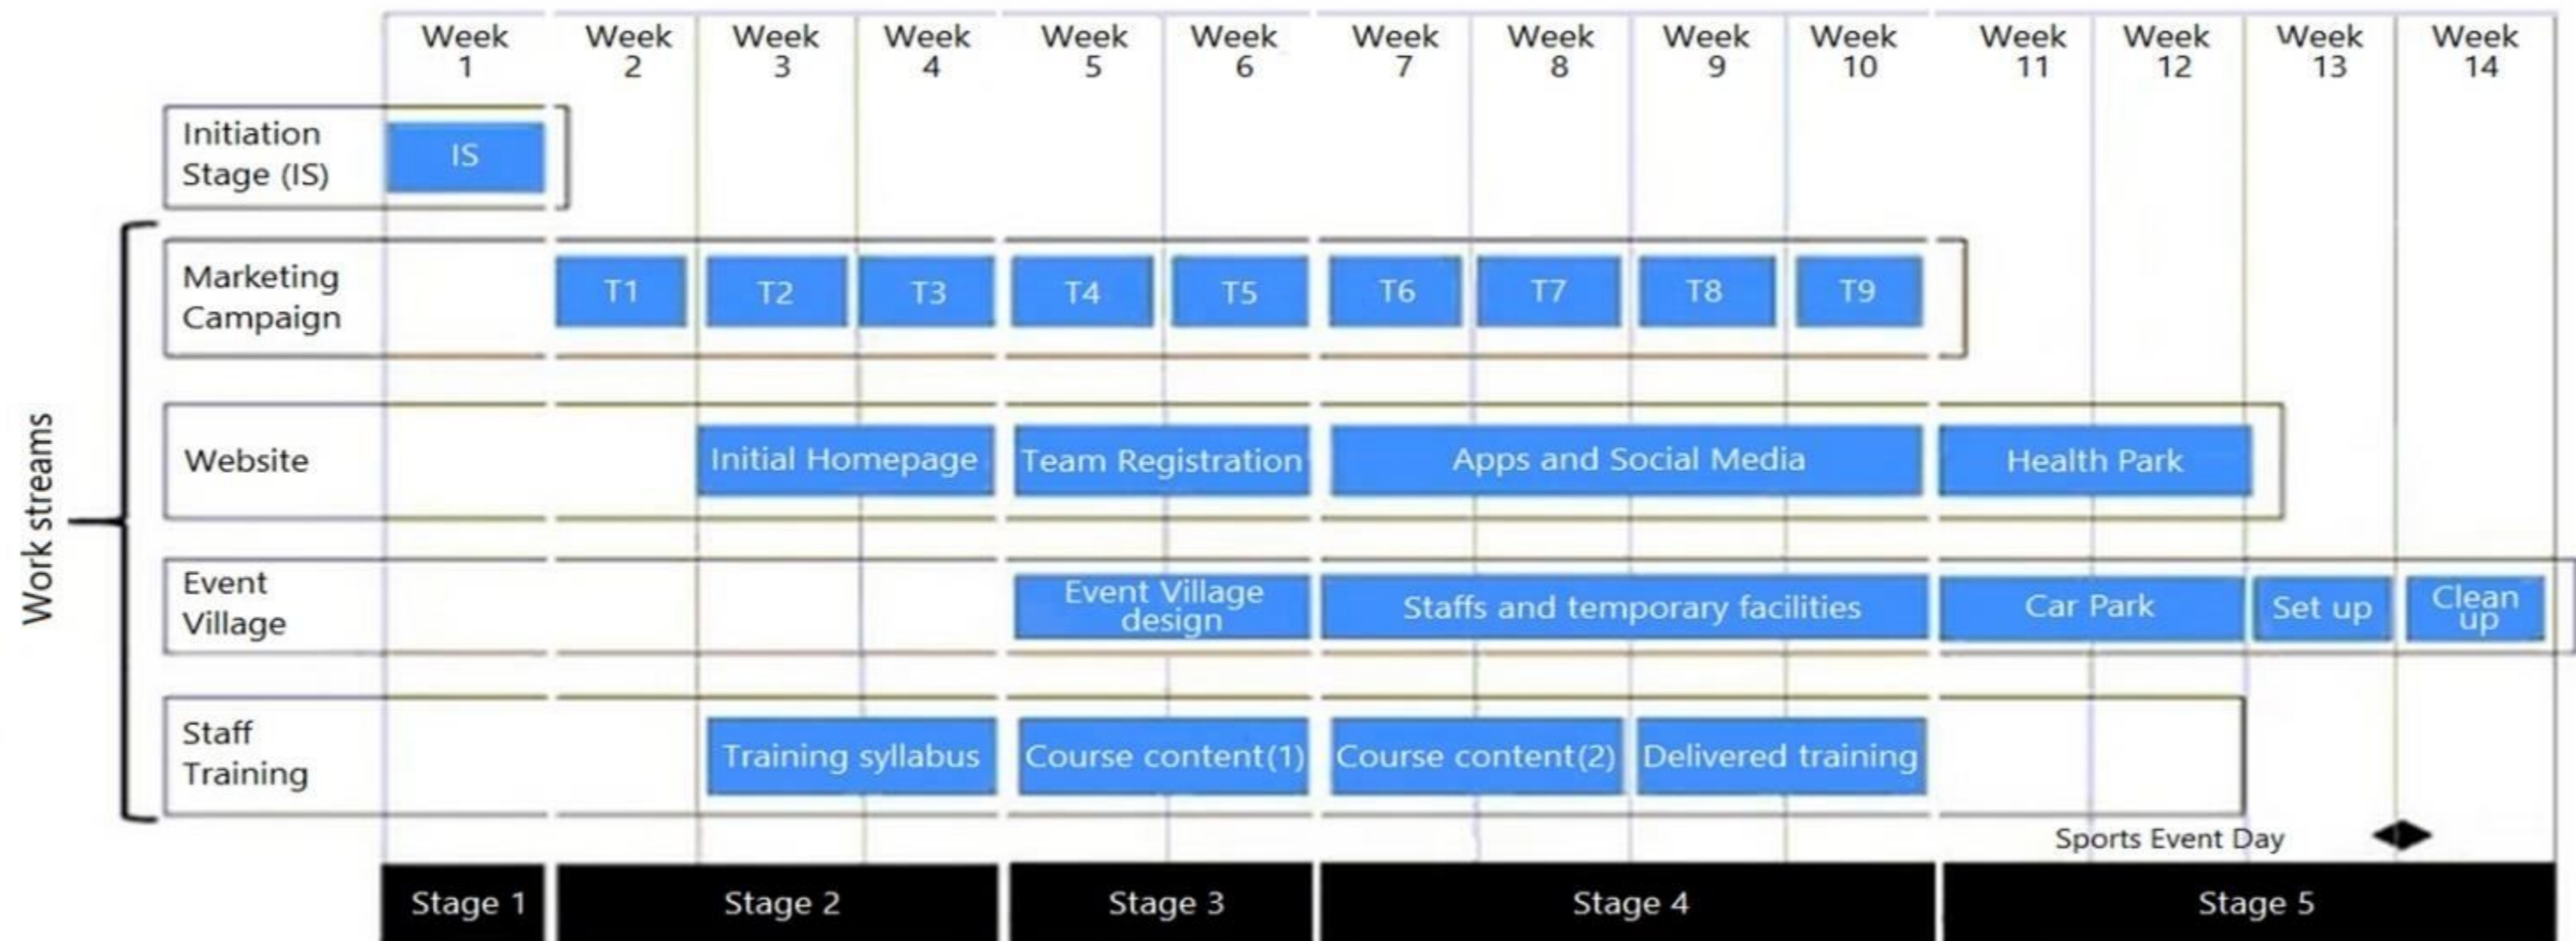

イベントビレッジ - 追加情報

イベントビレッジの目的は、サッカー トーナメントに参加するすべての人にさまざまなサービスとアクティビティを提供することです。

イベントビレッジは、いくつかの作業パッケージで構成されます。

1. イベントビレッジデザイン
2. トランポリンやブランコ、その他のスポーツアクティビティを試す機会を含む「キッズゾーン」

3. イベント資金を集めるために地元企業に販売される屋台：

大きな食品テント内の軽食の屋台。LGA は健康的な食事という目標を守りながら、町の料理の多様性を促進することに熱心に取り組んでいます。

イベント関連商品を販売する売店が30店あります。

LGA には、長期的な目標を推進し、現在および将来の取り組みを紹介するための5つのブースがあります。

4. 200台収容可能な駐車場。
5. 更衣室、トイレ、シャワーなどの臨時施設。
6. イベント村の撤収と後片付け。

イベントビレッジチームは、アジャイルでの作業経験がないさまざまな LGA 部門のスタッフから構成されています。

プロジェクトシナリオとイベントビレッジの追加情報を使用して、次の質問に答えます。

準備のため、イベント前日の 16:00 から 20:00 の間だけ、監視付きでベンダーブースへのアクセスが許可されることが合意されました。

これらの取り決めをすべてのベンダーに伝えるための最良の方法は何ですか？

- A. 図や写真の形で視覚化を使用します。
- B. 全員に電子メールを送信し、受信の確認を求めます。
- C. 電話で各出店者と協議します。
- D. ワークショップで対面してディスカッションを行います。

Answer: (解答を表示する)

すべてのベンダーに電子メールを送信すると、具体的な取り決めに明確に文書化して伝えることができ、受信確認を要求することで各ベンダーが情報を確認したことを確かめることができます。この方法は、複数のベンダーに同時に連絡を取り、後で詳細を参照できるようにするのにも効果的です。

最新問題: 11

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう！

(注シナリオ内の企業や人物は架空のものです)

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6 人制サッカー トーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16 歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGA の自己資金政策の一環として、これは LGA (したがって地元の納税者) の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツ センターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツ イベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカー トーナメントには、キッズ ゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベント ビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにある LGA 所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するためのウェブサイト、家族でのお出かけをサポートするイベント ビレッジ、イベントの運営とサポートを行うボランティアとしての LGA スタッフのトレーニング、申し込みを処理するバック オフィス プロセス、イベントの費用を賄うための資金調達。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の 4 つの作業ストリームで構成されています。


1. マーケティング
2. ウェブサイト
3. イベントビレッジ
4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGA は PRINCE2 の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクト マネージャーは PRINCE2 Agile に完全に精通しています。町の中心にある LGA ビルの 1 つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクト マネージャーはすでにドアに「ミッション コントロール」と書かれた看板を掲げています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。

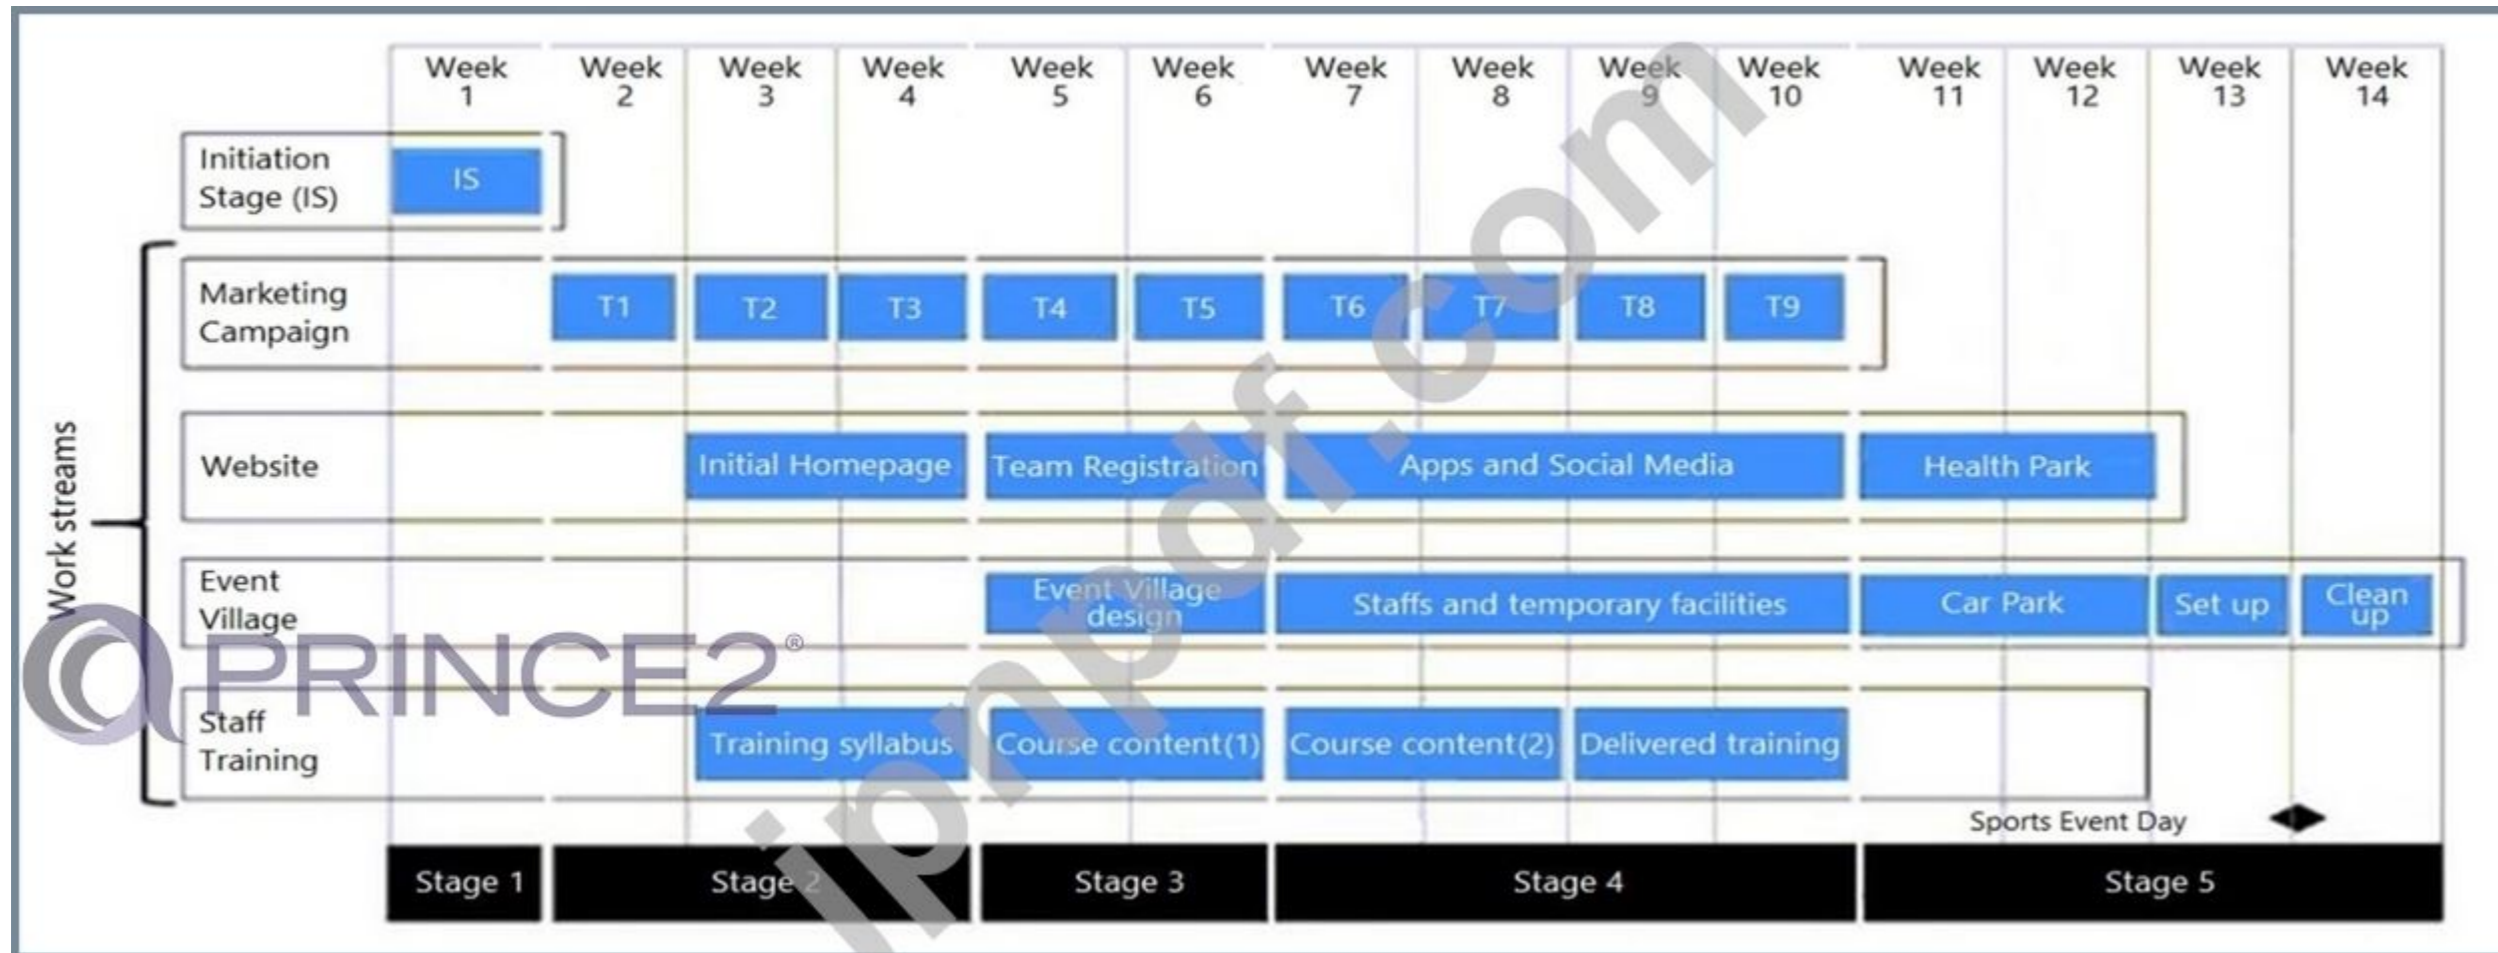

ウェブサイト - 追加情報

イベント用に新しい Web サイトが構築されます。この製品には 5 つの作業パッケージがあります。

1. 最初のホームページ:

イベントの詳細や競技ルールなどを掲載したウェブサイト。

2. チーム登録機能:

チーム名、選手名、年齢

連絡先;

支払い;

ランチパックの要件 (特別な食事要件を含む)

駐車場の要件。

3. イベントとその目的を宣伝するソーシャルメディア。

4. フィットネスや健康的な食事のアプリなど、健康的なライフスタイルを促進するアプリケーション (アプリ)。

5. ヘルスパーク :

ディスカッション フォーラムを含む、健康的なライフスタイルに関するオンラインナレッジベース。

ウェブサイトチームは IT 分野で豊富な経験があり、数年間アジャイルを使用しています。彼らは 5 つの 2 週間のタイムボックスを通じてウェブサイトを提供しています。チームはスクラム マスターを使用してスクラム プロセスを促進し、それに応じて人々を指導しています。

ウェブサイトチームはスクラムに非常に長けています。彼らはより困難な作業を評価するための一連のタスクを作成し、これをスプリント 0 と呼んでいます。

プロジェクトシナリオと Web サイトの追加情報を使用して、次の質問に答えます。

アプリとソーシャルメディアの作業パッケージには、次の要件が含まれます。

1. フィットネスアプリ - 必須

2. 健康的な食事アプリ - あればよい

バーンダウン チャートでは、理想的な進捗率と実際に提供されたものとの間のマイナスのギャップが拡大し続けています。チーム マネージャーは、健康的な食事アプリを提供しないことに決めました。ただし、要件 1 は現在のタイムボックス内で完了できないことが依然として予測されています。

チーム マネージャーは問題をプロジェクト マネージャーにエスカレーションし、プロジェクト マネージャーはチーム マネージャーに、バーンダウン チャートを情報ラジエーターからすぐに削除するように指示しました。このアプローチが、PRINCE2 Agile の動作を考慮しながら「例外による管理」の原則をどのように適用するかを最もよく説明するものは何ですか？

- A. プロジェクト マネージャーが問題の処理方法を決定するため、この原則は適切に適用されます。
- B. プロジェクト マネージャーの決定により、Web サイト チームが作業パッケージの制約内で自己組織化できるようになるため、この原則は適切に適用されます。
- C. ウェブサイト チームには作業パッケージに関連する問題に対処する権限が与えられるべきなので、この原則は適切に適用されていません。
- D. ウェブサイト チームの全員が作業パッケージが許容範囲外であることを認識する必要があるため、原則が適切に適用されていません。

Answer: C (メッセージを残す)

プロジェクト マネージャーが情報ラジエーターからバーンダウン チャートを削除すると、チームが進捗状況と課題を視覚化して管理する能力が制限されます。PRINCE2 Agile では、チームが作業パッケージ内の問題を処理できるようにする必要があります。バーンダウン チャートなどのツールによる透明性は、自己管理とコラボレーションに不可欠です。

最新問題: 12

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう！

(注シナリオ内の企業や人物は架空のものです)

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6 人制サッカー トーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16 歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGA の自己資金政策の一環として、これは LGA (したがって地元の納税者) の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツ センターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツ イベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカー トーナメントには、キッズ ゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベント ビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにある LGA 所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するためのウェブサイト。

家族でのお出かけをサポートするイベントビレッジ。

イベントの運営とサポートを行うボランティアとしてのLGAスタッフのトレーニング。

アプリケーションを処理するバックオフィスプロセス。

イベントの費用を賄うための募金活動。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の 4 つの作業ストリームで構成されています。


1. マーケティング
2. ウェブサイト
3. イベントビレッジ
4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGAはPRINCE2の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクトマネージャーはPRINCE2 Agileに完全に精通しています。町の中心にあるLGAビルの1つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクトマネージャーはすでにドアに「ミッションコントロール」と書かれた看板を掲げています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。

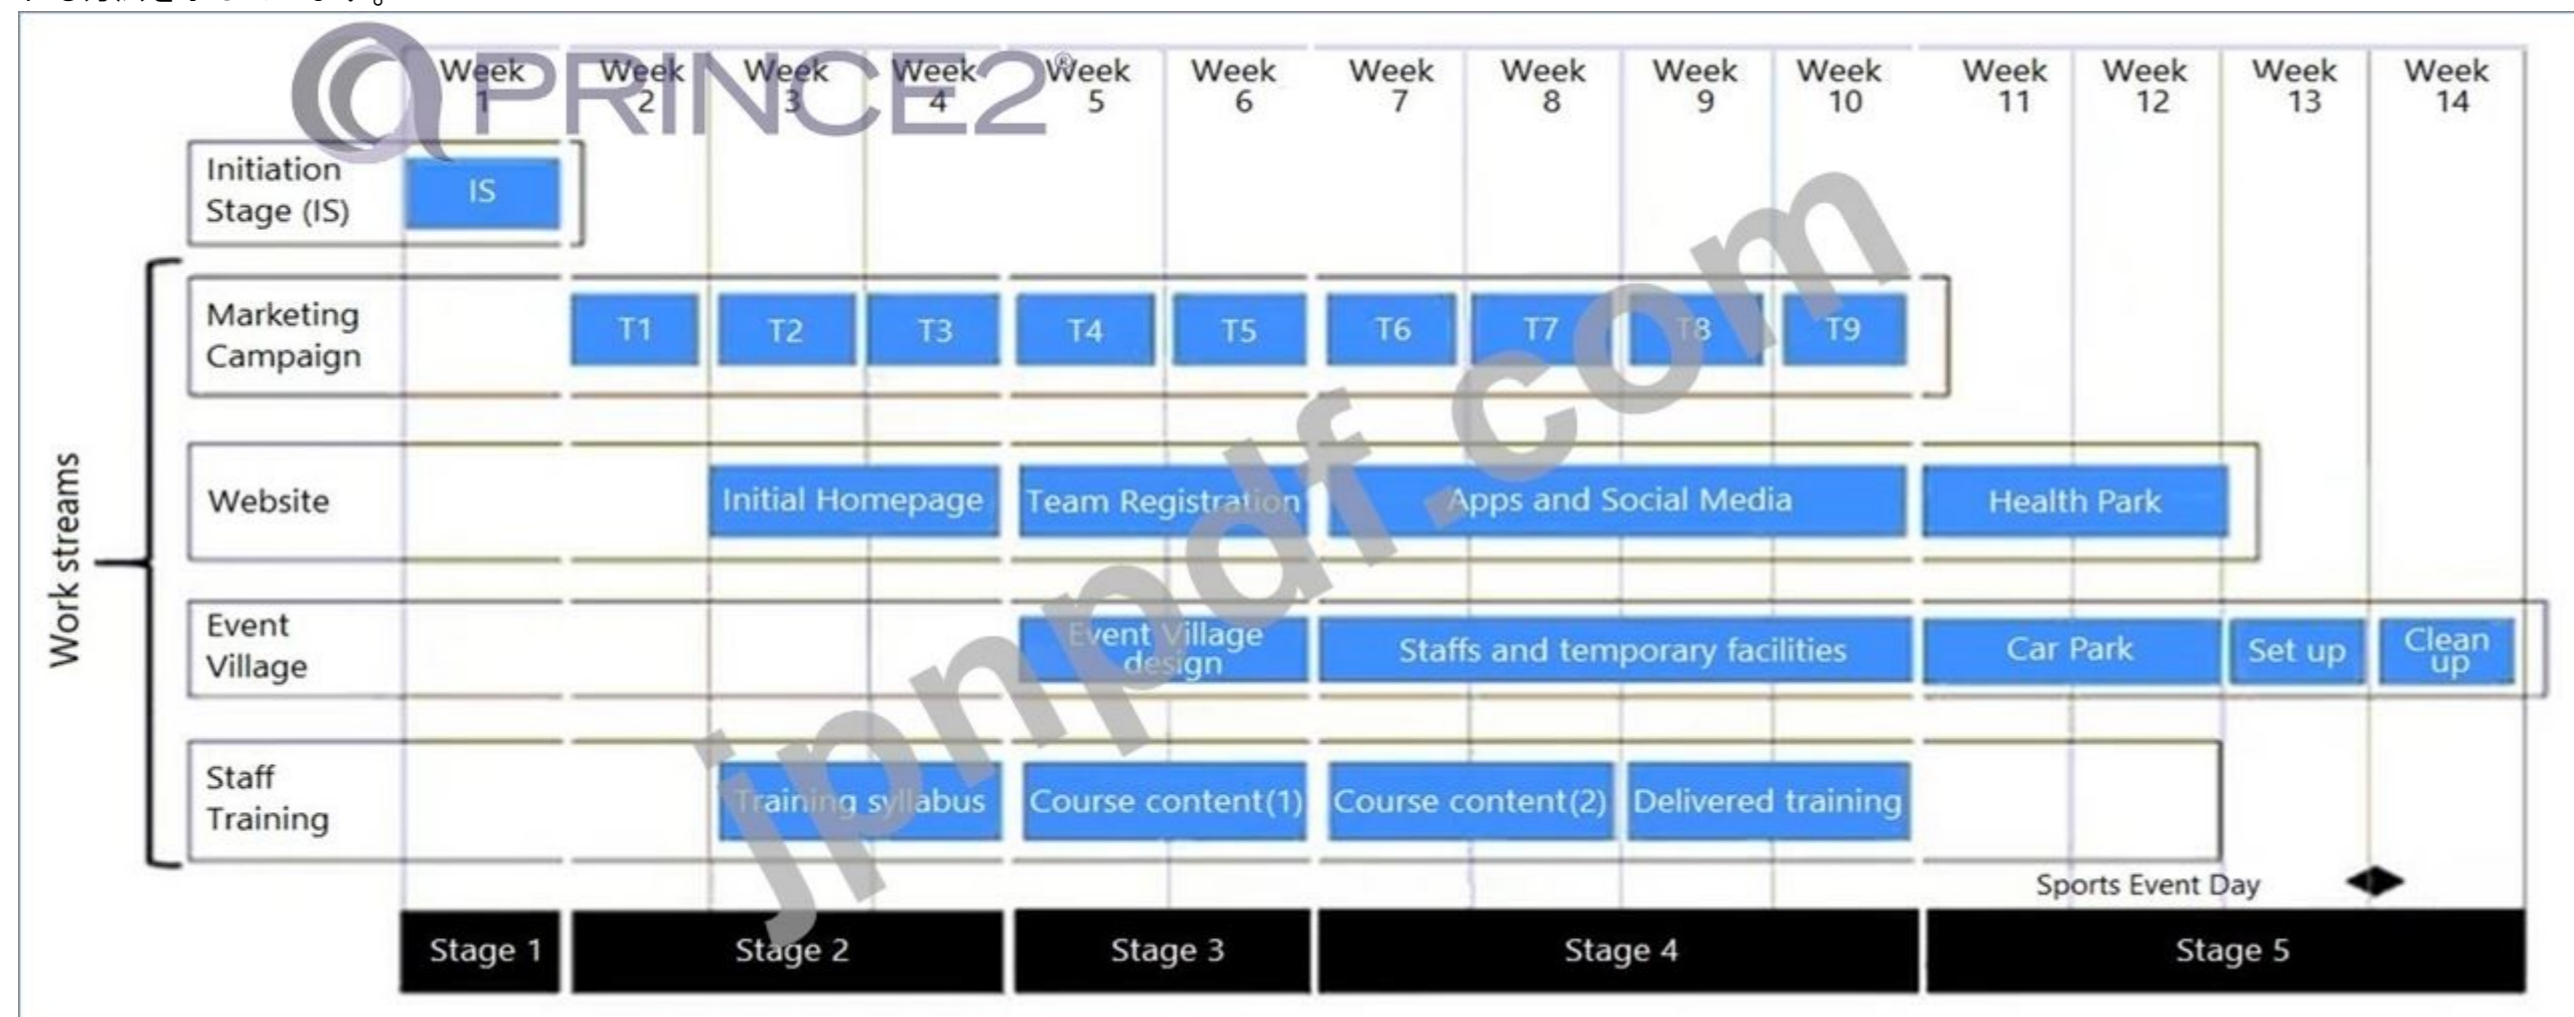

ウェブサイト - 追加情報

イベント用に新しいWebサイトが構築されます。この製品には5つの作業パッケージがあります。

1. 最初のホームページ:

イベントの詳細や競技ルールなどを掲載したウェブサイト。

2. チーム登録機能:

チーム名、選手名、年齢

連絡先;

支払い;

ランチパックの要件 (特別な食事要件を含む)

駐車場の要件。

3. イベントとその目的を宣伝するソーシャルメディア。

4. フィットネスや健康的な食事のアプリなど、健康的なライフスタイルを促進するアプリケーション (アプリ)。

5. ヘルスパーク:

ディスカッション フォーラムを含む、健康的なライフスタイルに関するオンライン ナレッジ ベース。

ウェブサイトチームはIT分野で豊富な経験があり、数年間アジャイルを使用しています。彼らは5つの2週間のタイムボックスを通じてウェブサイトを提供しています。チームはスクラムマスターを使用してスクラムプロセスを促進し、それに応じて人々を指導しています。

ウェブサイトチームはスクラムに非常に長けています。彼らはより困難な作業を評価するための一連のタスクを作成し、これをスプリント0と呼んでいます。

プロジェクトシナリオとWebサイトの追加情報を使用して、次の質問に答えます。

プロジェクトマネージャーは、Webサイトのワークストリームをリードするスクラムマスターに、チームマネージャーの役割を担うよう依頼しました。チームマネージャーは、プロジェクトマネージャーの唯一の連絡窓口として機能し、チームマネージャーの責任を負います。チームマネージャーは、引き続きWebサイトチームの指導とリードを行います。

組織のテーマをどのように調整するかを最もよく表しているのはどれですか？

- A. スクラムマスターは、チームマネージャーの責任を負いながら、スクラムチームに貢献する必要があります。
- B. プロジェクトマネージャーは、Webサイトチームが現在使用しているアジャイル動作よりも少ないアジャイル動作を使用することを望んでいます。
- C. スクラムマスターを含むウェブサイトチームの各メンバーは、複数のタスクを実行できる必要があります。
- D. 小規模プロジェクトではチームは1つだけであり、Webサイトチームがすべての配信役割を担う必要があります。

Answer: A (メッセージを残す)

スクラムマスターをチームマネージャーとして機能させることで、チームをサポートし、チームに貢献するスクラムマスターの役割が強調されると同時に、プロジェクトマネージャーに必要なコミュニケーションと責任も管理します。このアプローチにより、アジャイルの原則が維持され、チーム内の役割と責任が明確になります。

最新問題: 13

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう！

(注シナリオ内の企業や人物は架空のものです)

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6人制サッカートーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGAの自己資金政策の一環として、これはLGA(したがって地元の納税者)の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツセンターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツイベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカートーナメントには、キッズゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベントビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにあるLGA所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するためのウェブサイト、家族でのお出かけをサポートするイベントビレッジ、イベントの運営とサポートを行うボランティアとしてのLGAスタッフのトレーニング、申し込みを処理するバックオフィスプロセス、イベントの費用を賄うための資金調達。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の4つの作業ストリームで構成されています。


1. マーケティング
2. ウェブサイト
3. イベントビレッジ
4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGAはPRINCE2の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクトマネージャーはPRINCE2 Agileに完全に精通しています。町の中心にあるLGAビルの1つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクトマネージャーはすでにドアに「ミッションコントロール」と書かれた看板を掲げています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。

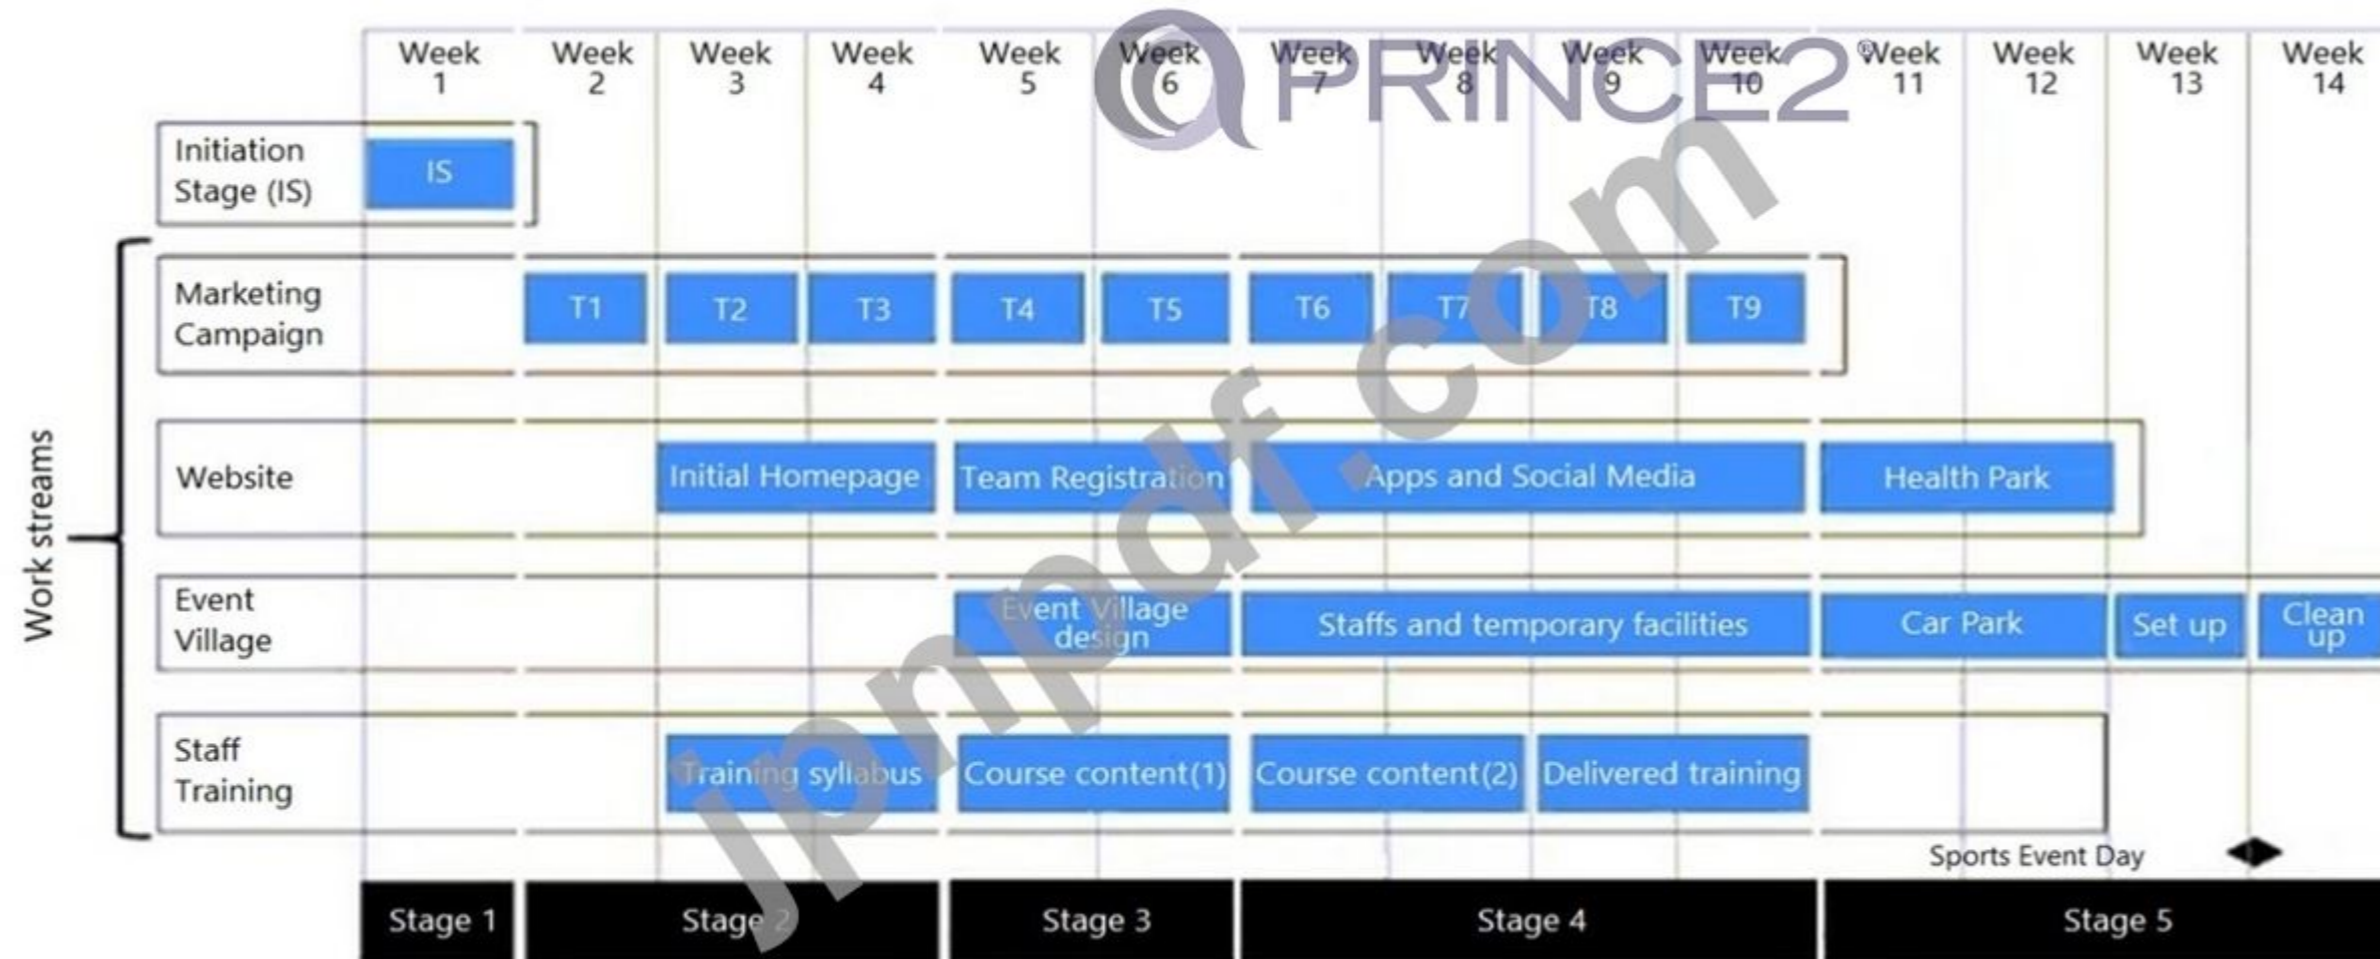

マーケティング - 追加情報

マーケティング キャンペーンでは、次の 2 つの主要な領域を宣伝します。

1. サッカートーナメント、イベントビレッジ、募金活動を含むイベント自体。
2. LGA の長期目標は、16 歳未満の子供たちの体力を向上させることです。

マーケティング チームは初期のスクラム トレーニングを受けましたが、それをマーケティング業務にどのように適用できるかはわかりません。

マーケティング チームは、キャンペーンに多くの時間を費やす前に、プロジェクト マネージャーがキャンペーンの明確な概要を提供することを強く望んでいます。

彼らはさまざまなマーケティング チャンネルでの作業経験を持っていますが、この種のイベント、特に LGA の長期的な健康目標を促進するためにどのチャンネルが最も効果的に機能するかはわかりません。

マーケティング チームは、イベントの 2 つの目的に割り当てる優先順位を明確にしていません。

マーケティング チームは毎週広告や販促資料を発行し、メッセージを最新の状態に保つために各号に詳しい情報を掲載します。

9 週間のタイムボックスのそれぞれの終了時に、9 つのリリースが予定されています。

マーケティング ワーク ストリーム内の 9 つのタイムボックスには、次の内容が含まれるようにスケジュールされています。

広告:

ラジオインタビュー;

配布物/チラシの作成

町中やイベント会場に掲示する横断幕や看板。

ウェブサイトおよびソーシャルメディアコンテンツの提供。

地元企業が掲示する宣伝ポスター。

プロジェクト シナリオとマーケティング追加情報を使用して、次の質問に答えます。

プロジェクト マネージャーは、ステージ 2 をさらに細分化して、新聞広告の毎週の発行にリンクされたステージ境界をさらに設定することを推奨しています。

タイムラインを使用して、この提案を「段階的に管理する」原則に照らして最も適切に評価する記述はどれですか。

- A. ステージ境界が短いとチーム間のコラボレーションの機会が増えるため、この原則はよく当てはまります。
- B. ステージ境界が短いため、プロジェクトは早く失敗して早く学習できるため、この原則はよく当てはまります。
- C. ステージ境界は各新しいタイムボックスの開始時に設定する必要があるため、原則が適切に適用されません。
- D. 3 か月間のプロジェクトでは、ステージ境界は通常月単位であるため、この原則は適切に適用されていません。

Answer: B (メッセージを残す)

「段階的に管理する」という原則は、プロジェクトを管理可能な段階に分割して進捗状況を評価し、必要に応じて適応することを強調しています。毎週の広告の公開にリンクされた短い段階の境界を作成することで、プロジェクトは問題を迅速に特定して戦略を調整し、迅速に学習するアプローチを促進できます。

最新問題: 14

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう！

(注シナリオ内の企業や人物は架空のものです)

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6 人制サッカー トーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16 歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGA の自己資金政策の一環として、これは LGA (したがって地元の納税者) の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツ センターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツ イベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカー トーナメントには、キッズ ゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベント ビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにある LGA 所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するためのウェブサイト、家族でのお出かけをサポートするイベント ビレッジ、イベントの運営とサポートを行うボランティアとしての LGA スタッフのトレーニング、申し込みを処理するバック オフィス プロセス、イベントの費用を賄うための資金調達。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の 4 つの作業ストリームで構成されています。

1. マーケティング
2. ウェブサイト
3. イベントビレッジ
4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGA は PRINCE2 の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクト マネージャーは PRINCE2 Agile に完全に精通しています。町の中心にある LGA ビルの 1 つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクト マネージャーはすでにドアに「ミッション コントロール」と書かれた看板を掲げています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。



ウェブサイト - 追加情報

イベント用に新しい Web サイトが構築されます。この製品には 5 つの作業パッケージがあります。

1. 最初のホームページ:

イベントの詳細や競技ルールなどを掲載したウェブサイト。

2. チーム登録機能:

チーム名、選手名、年齢

連絡先;

支払い;

ランチパックの要件 (特別な食事要件を含む)

駐車場の要件。

3. イベントとその目的を宣伝するソーシャルメディア。

4. フィットネスや健康的な食事のアプリなど、健康的なライフスタイルを促進するアプリケーション (アプリ)。

5. ヘルスパーク :

ディスカッション フォーラムを含む、健康的なライフスタイルに関するオンラインナレッジベース。

ウェブサイトチームは IT 分野で豊富な経験があり、数年間アジャイルを使用しています。彼らは 5 つの 2 週間のタイムボックスを通じてウェブサイトを提供しています。チームはスクラム マスターを使用してスクラム プロセスを促進し、それに応じて人々を指導しています。

ウェブサイトチームはスクラムに非常に長けています。彼らはより困難な作業を評価するための一連のタスクを作成し、これをスプリント 0 と呼んでいます。

プロジェクトシナリオと Web サイトの追加情報を使用して、次の質問に答えます。

プロジェクトは複数のチームで構成されており、配信領域ごとに 1 つずつあります。各チームには独自のチーム マネージャーがいます。

健康の専門家である LGA の従業員が、4 つのデリバリー チームすべての顧客担当者として任命されました。

このアプローチが組織のテーマをどのように調整するかを最もよく説明するものは何ですか？

- A. 顧客担当者はプロジェクトにフルタイムで取り組む必要があるため、テーマを適切に調整します。
- B. 顧客担当者がチームに専門的な情報を提供するため、テーマが適切に調整されます。
- C. 顧客の専門家が健康に関する専門知識を提供する必要があるため、テーマのカスタマイズが不十分です。
- D. 各デリバリー チームには専用のリソースと安定したチームが必要なため、テーマのカスタマイズが不十分です。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

健康に関する専門知識を持つ顧客担当者を任命することで、すべてのデリバリー チームが業務に役立つ専門知識と洞察にアクセスできるようになります。この役割は、関連情報を提供し、プロジェクトが顧客のニーズと期待に合致していることを確認することでチームを効果的にサポートし、複数のチーム間のコラボレーションを強化します。

最新問題: 15

PRINCE2 Agile と統合できるアジャイル手法またはアプローチを最もよく表すものはどれですか？

- A. 進行中の作業を視覚化し、管理することでシステムの改善を促進します。
- B. 適用可能な原則、テーマ、プロセスを調整するためのガイダンスを提供します。
- C. 合意された期限内に納品するために品質テストを削減します。
- D. 個人ややり取りよりもプロセスとツールを優先します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

このアプローチはアジャイルの原則に沿っており、継続的な改善と効果的なワークフロー管理を重視しており、PRINCE2 Agile の構造化されたフレームワークを補完することができます。

最新問題: 16

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう！

(注シナリオ内の企業や人物は架空のものです)

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6 人制サッカー トーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16 歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGA の自己資金政策の一環として、これは LGA (したがって地元の納税者) の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツ センターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツ イベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカー トーナメントには、キッズ ゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベント ビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにある LGA 所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するウェブサイト、家族でのお出かけをサポートするイベントビレッジ。

イベントの運営とサポートを行うボランティアとしての LGA スタッフのトレーニング。

アプリケーションを処理するバックオフィスプロセス。

イベントの費用を賄うための募金活動。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の 4 つの作業ストリームで構成されています。

1. マーケティング
2. ウェブサイト

- 3. イベントビレッジ
- 4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGA は PRINCE2 の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクト マネージャーは PRINCE2 Agile に完全に精通しています。町の中心にある LGA ビルの 1 つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクト マネージャーはすでにドアに「ミッション コントロール」と書かれた看板を掲げています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。



マーケティング - 追加情報

マーケティング キャンペーンでは、次の 2 つの主要な領域を宣伝します。

1. サッカートーナメント、イベントビレッジ、募金活動を含むイベント自体。
2. LGA の長期目標は、16 歳未満の子供たちの体力を向上させることです。

マーケティング チームは初期のスクラム トレーニングを受けましたが、それをマーケティング業務にどのように適用できるかはわかりません。

マーケティング チームは、キャンペーンに多くの時間を費やす前に、プロジェクト マネージャーがキャンペーンの明確な概要を提供することを強く望んでいます。

彼らはさまざまなマーケティング チャンネルでの作業経験を持っていますが、この種のイベント、特に LGA の長期的な健康目標を促進するためにどのチャンネルが最も効果的に機能するかはわかりません。

マーケティング チームは、イベントの 2 つの目的に割り当てる優先順位を明確にしていません。

マーケティング チームは毎週広告や販促資料を発行し、メッセージを最新の状態に保つために各号に詳しい情報を掲載します。

9 週間のタイムボックスのそれぞれの終了時に、9 つのリリースが予定されています。

マーケティング ワーク ストリーム内の 9 つのタイムボックスには、次の内容が含まれるようにスケジュールされています。

広告:

ラジオインタビュー;

配布物/チラシの作成

町中やイベント会場に掲示する横断幕や看板。

ウェブサイトおよびソーシャルメディアコンテンツの提供。

地元企業が掲示する宣伝ポスター。

プロジェクトシナリオとマーケティング追加情報を使用して、次の質問に答えます。

マーケティングチームは、毎日のミーティングで、Webサイトのページに表示される情報と写真のバージョンとレビューのステータスを把握できないことに気づきました。

製品提供の管理プロセスにすぐに役立つ最も有用なコプラクティスはどれでしょうか？

- A. 累積フロー図を参照して、残りの作業のステータスを確認します。
- B. 毎日のスタンドアップで Web ページの配信を遅らせた場合の影響を特定します。
- C. スイムレーン」を備えた「チケット」ボードを使用して、作業のステータスを視覚化します。
- D. 失敗しても安全な実験を実行して、より良い作業方法を特定します。

Answer: C (メッセージを残す)

「スイムレーン」付きの「チケット」ボードを使用すると、マーケティングチームはさまざまなバージョンを視覚化し、Webサイトの情報と写真のステータスを確認できます。この方法により、作業の現在の状態が明確になり、透明性が促進され、チーム内でのコミュニケーションが改善され、最終的には製品提供の効果的な管理がサポートされます。

有効な **PRINCE2-Agile-Practitioner** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PRINCE2-Agile-Practitioner 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PRINCE2-Agile-Practitioner** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com PRINCE2-Agile-Practitioner 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PRINCE2-Agile-Practitioner 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/PRINCE2/PRINCE2-Agile-Practitioner-mondaishu.html> (5030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう！

(注シナリオ内の企業や人物は架空のものです)

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6 人制サッカー トーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16 歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGA の自己資金政策の一環として、これは LGA (したがって地元の納税者) の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツ センターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツ イベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカー トーナメントには、キッズ ゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベント ビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにある LGA 所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するウェブサイト、「家族でのお出かけ」をサポートするイベント ビレッジ、イベントを運営およびサポートするボランティアとしての LGA スタッフのトレーニング。

アプリケーションを処理するバックオフィスプロセス。

イベントの費用を賄うための募金活動。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の 4 つの作業ストリームで構成されています。


1. マーケティング
2. ウェブサイト
3. イベントビレッジ
4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGA は PRINCE2 の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクト マネージャーは PRINCE2 Agile に完全に精通しています。町の中心にある LGA ビルの 1 つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクト マネージャーはすでにドアに「ミッションコントロール」と書かれた看板を掲げています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。

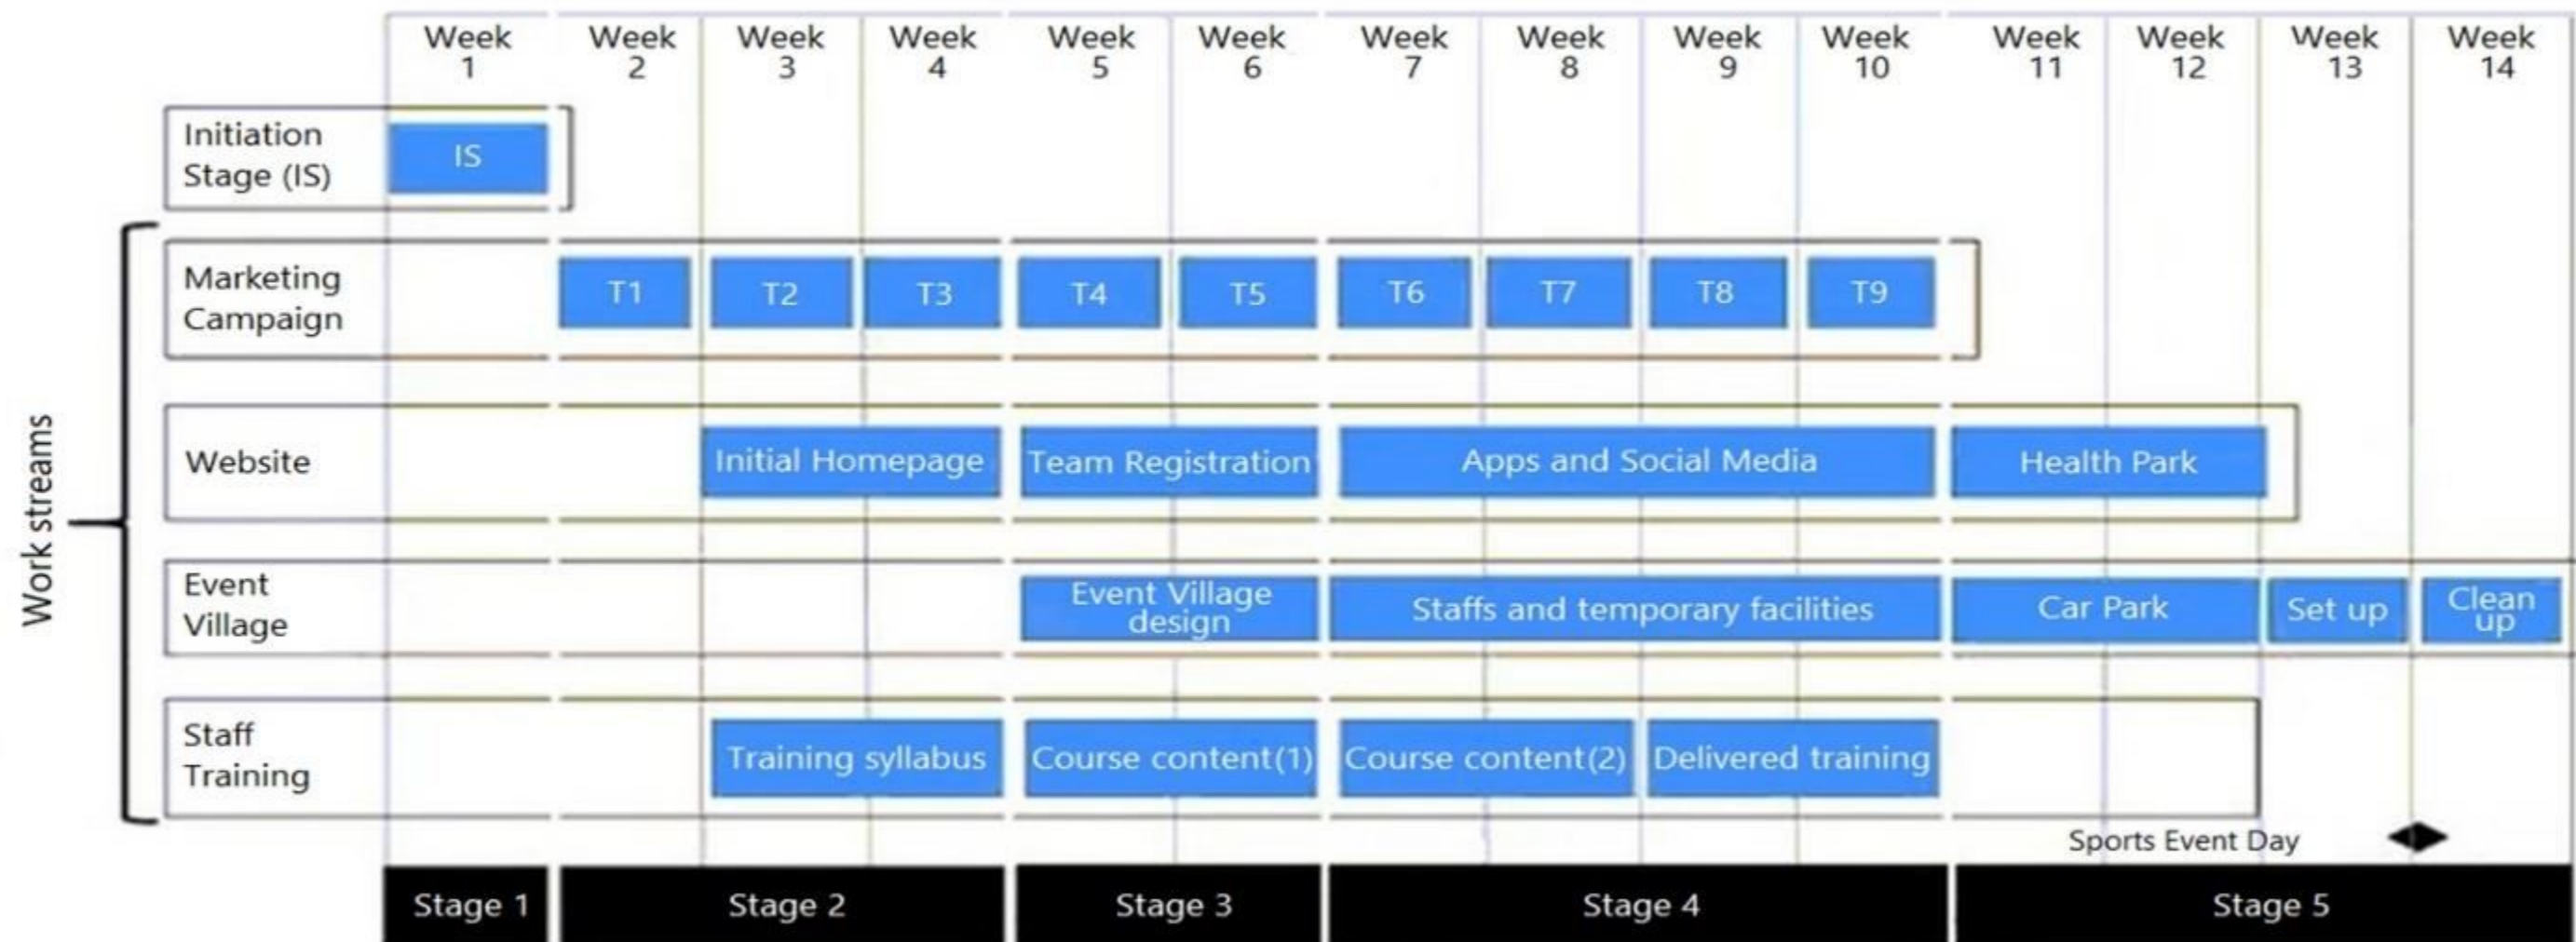

マーケティング - 追加情報

マーケティング キャンペーンでは、次の 2 つの主要な領域を宣伝します。

1. サッカートーナメント、イベントビレッジ、募金活動を含むイベント自体。
2. LGA の長期目標は、16 歳未満の子供たちの体力を向上させることです。

マーケティング チームは初期のスクラム トレーニングを受けましたが、それをマーケティング業務にどのように適用できるかはわかりません。

マーケティング チームは、キャンペーンに多くの時間を費やす前に、プロジェクト マネージャーがキャンペーンの明確な概要を提供することを強く望んでいます。

彼らはさまざまなマーケティング チャンネルでの作業経験を持っていますが、この種のイベント、特に LGA の長期的な健康目標を促進するためにどのチャンネルが最も効果的に機能するかはわかりません。

マーケティング チームは、イベントの 2 つの目的に割り当てる優先順位を明確にしていません。

マーケティング チームは毎週広告や販促資料を発行し、メッセージを最新の状態に保つために各号に詳しい情報を掲載します。

9 週間のタイムボックスのそれぞれの終了時に、9 つのリリースが予定されています。

マーケティング ワーク ストリーム内の 9 つのタイムボックスには、次の内容が含まれるようにスケジュールされています。

広告:

ラジオインタビュー;

配布物/チラシの作成

町中やイベント会場に掲示する横断幕や看板。

ウェブサイトおよびソーシャルメディアコンテンツの提供。

地元企業が掲示する宣伝ポスター。

プロジェクト シナリオとマーケティング追加情報を使用して、次の質問に答えます。

上級ユーザーは、収益を寄付する 2 番目の慈善団体を指定しました。今後使用するすべてのマーケティング資料は、新しい慈善団体を宣伝する必要があります。最初の慈善団体のみを宣伝するバナーは、以前のタイムボックスですすでに作成、配信、承認されています。既存のバナーに新しいロゴを追加する作業は少ないです。

すでに作成されたバナーに関して、マーケティング チームはこの変更にとのように対応する必要がありますか?

A. バナーの商品説明にある品質基準を参考に、詳細レベルで対応します。

B. バナーサプライヤーが修正すべき仕様を満たしていないアイテムとして扱います。

C. 既存の製品の詳細を変更するリクエストとしてプロジェクト ボードにエスカレーションします。

D. 現在のタイムボックスまたは次のタイムボックスで作業を計画し、優先順位を付けるときに対処します。

Answer: D (メッセージを残す)

新しいロゴを追加する作業は少ないため、現在のまたは次のタイムボックスのタスクの計画と優先順位付け中にこの変更を組み込むのが効率的です。これにより、チームはプロジェクト フローを大幅にエスカレートしたり中断したりすることなく、新しい要件に適応できます。

最新問題: 18

プロジェクトシナリオ - サッカーで健康になろう!

(注シナリオ内の企業や人物は架空のものです)

導入

地方自治体当局 (LGA) は、6 人制サッカー トーナメントを開催することを決定しました。このトーナメントは、16 歳未満の子供の体力向上を目指す国家の取り組みによって設定された目標の達成に貢献します。LGA の自己資金政策の一環として、これは LGA (したがって地元の納税者) の負担なしで達成されなければなりません。イベントの費用は、トーナメントへの参加登録チームが支払う料金、スポンサーシップ、当日に集められた資金によって賄われます。余剰金は、地元のスポーツ センターの維持に使用されます。

チームは男女とも、いくつかの年齢グループのいずれかに登録できます。また、サポートのために家族も参加していただくようお願いします。

このスポーツ イベントは、家族で楽しめるイベントとして企画されています。サッカー トーナメントには、キッズ ゾーン、ケータリング、駐車場、移動式更衣室、トイレを備えたイベント ビレッジが設けられます。トーナメントは、町の中心部近くにある LGA 所有のサッカー場で行われますが、スペースは限られています。

範囲

プロジェクトの初期範囲は次のとおりです。

イベントを宣伝するためのマーケティングキャンペーン。

イベントのオープニングを飾る有名人。

イベントに関する情報を提供し、申し込みを処理するためのウェブサイト、家族でのお出かけをサポートするイベント ビレッジ、イベントの運営とサポートを行うボランティアとしての LGA スタッフのトレーニング、申し込みを処理するバック オフィス プロセス、イベントの費用を賄うための資金調達。

この作業を実行するために、プロジェクトは次の 4 つの作業ストリームで構成されています。

1. マーケティング

2. ウェブサイト

3. イベントビレッジ
4. スタッフのトレーニング

プロジェクトの背景

LGA は PRINCE2 の使用経験が豊富で、このイベントを単一のプロジェクトとして運営します。プロジェクト マネージャーは PRINCE2 Agile に完全に精通しています。町のある中心にある LGA ビルの 1 つのオフィスが、プロジェクト期間中ずっとプロジェクトに割り当てられます。オフィスはマーケティング部門の向かい側にあり、プロジェクト マネージャーはすでにドアに「ミッション コントロール」と書かれた看板を掲げています。

タイムライン

初期のタイムラインが提案されており、次の図に示されています。タイムラインは、アジャイルな作業方法によって変化する可能性があります。タイムラインは、作業ストリームが作業パッケージやタイムボックスに分割される方法を示しています。



ウェブサイト - 追加情報

イベント用に新しい Web サイトが構築されます。この製品には 5 つの作業パッケージがあります。

1. 最初のホームページ:

イベントの詳細や競技ルールなどを掲載したウェブサイト。

2. チーム登録機能:

チーム名、選手名、年齢

連絡先;

支払い;

ランチパックの要件 (特別な食事要件を含む)

駐車場の要件。

3. イベントとその目的を宣伝するソーシャル メディア。

4. フィットネスや健康的な食事のアプリなど、健康的なライフスタイルを促進するアプリケーション (アプリ)。

5. ヘルスパーク :

ディスカッション フォーラムを含む、健康的なライフスタイルに関するオンライン ナレッジ ベース。

ウェブサイト チームは IT 分野で豊富な経験があり、数年間アジャイルを使用しています。彼らは 5 つの 2 週間のタイムボックスを通じてウェブサイトを提供しています。チームはスクラム マスターを使用してスクラム プロセスを促進し、それに応じて人々を指導しています。

ウェブサイト チームはスクラムに非常に長けています。彼らはより困難な作業を評価するための一連のタスクを作成し、これをスプリント 0 と呼んでいます。

プロジェクト シナリオと Web サイトの追加情報を使用して、次の質問に答えます。

ウェブサイト チーム マネージャーは、サプライヤーの代表者がソーシャル メディア ウェブサイトで作業する必要があることを認識しました。

定義された役割と責任」の原則に従って、このニーズを満たすことができるのは誰でしょうか？

- A. ソーシャル メディア チャンネルの配信方法を理解しているユーザーを代表できる上級ユーザー。
- B. プロジェクト全体とソーシャル メディアの要件を十分に把握しているプロジェクト マネージャー。
- C. ウェブサイトとその配信方法に関する技術的な知識を持つ上級サプライヤー。
- D. ソーシャル メディア ウェブサイトの配信を主導するチーム マネージャー。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

上級サプライヤーは、ウェブサイトの配信に関する技術的な知識と理解を備えているため、サプライヤーの利益を代表し、ソーシャル メディア ウェブサイトがプロジェクト要件を効果的に満たしていることを保証するのに最適な候補者です。

Valid PRINCE2-Agile-Practitioner Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing PRINCE2-Agile-Practitioner Exam! GoShiken.com now offer the **newest PRINCE2-Agile-Practitioner exam dumps**, the GoShiken.com PRINCE2-Agile-Practitioner exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com PRINCE2-Agile-Practitioner dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/PRINCE2/PRINCE2-Agile-Practitioner-mondaishu.html> (50 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)
